


ごみ処理施設関連工事【工事進捗状況】

工事名	ごみ処理施設関連工事
工事場所	京都府宮津市字須津地内
工期	平成27年11月26日～平成28年5月31日
請負者	金下建設株式会社
現場代理人	吉岡 照雄
現場事務所	京都府宮津市字須津1676-1 金下建設(株) 須津事務所
TEL	0772-46-5680
FAX	0772-46-5681

【工事進捗率】

	3月	4月
計画	29%	50%
実施	30%	

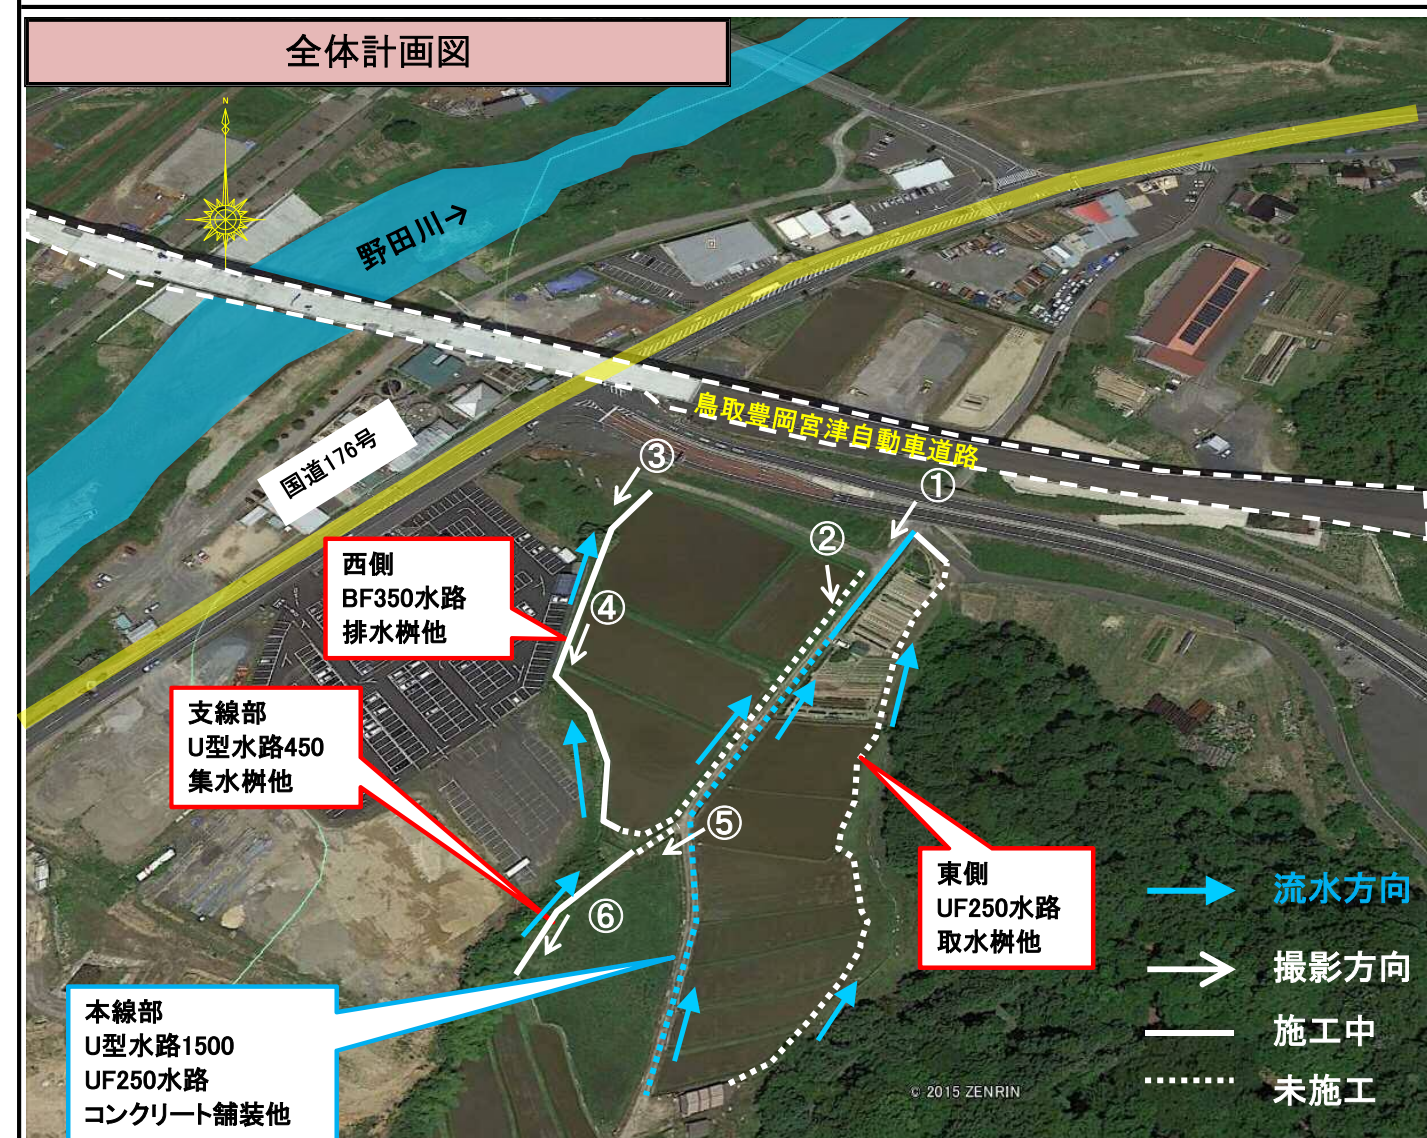

写真① 本線部:U形水路B1500



写真② 本線部:U形水路B1500



写真③ 西側:BF-350(排水路)



写真④ 西側:BF-350(排水路)



写真⑤ 支線部:U形水路PU1-450



写真⑥ 支線部:U形水路PU1-450




平成28年3月末撮影

ごみ処理施設関連工事【工事進捗状況】

工事名	ごみ処理施設関連工事
工事場所	京都府宮津市字須津地内
工期	平成27年11月26日～平成28年5月31日
請負者	金下建設株式会社
現場代理人	吉岡 照雄
現場事務所	京都府宮津市字須津1676-1 金下建設(株) 須津事務所
TEL	0772-46-5680
FAX	0772-46-5681

【工事進捗率】	3月	4月	5月
	計画 29%	50%	91%
	実施 30%	52%	

※5月中に工期の変更予定。

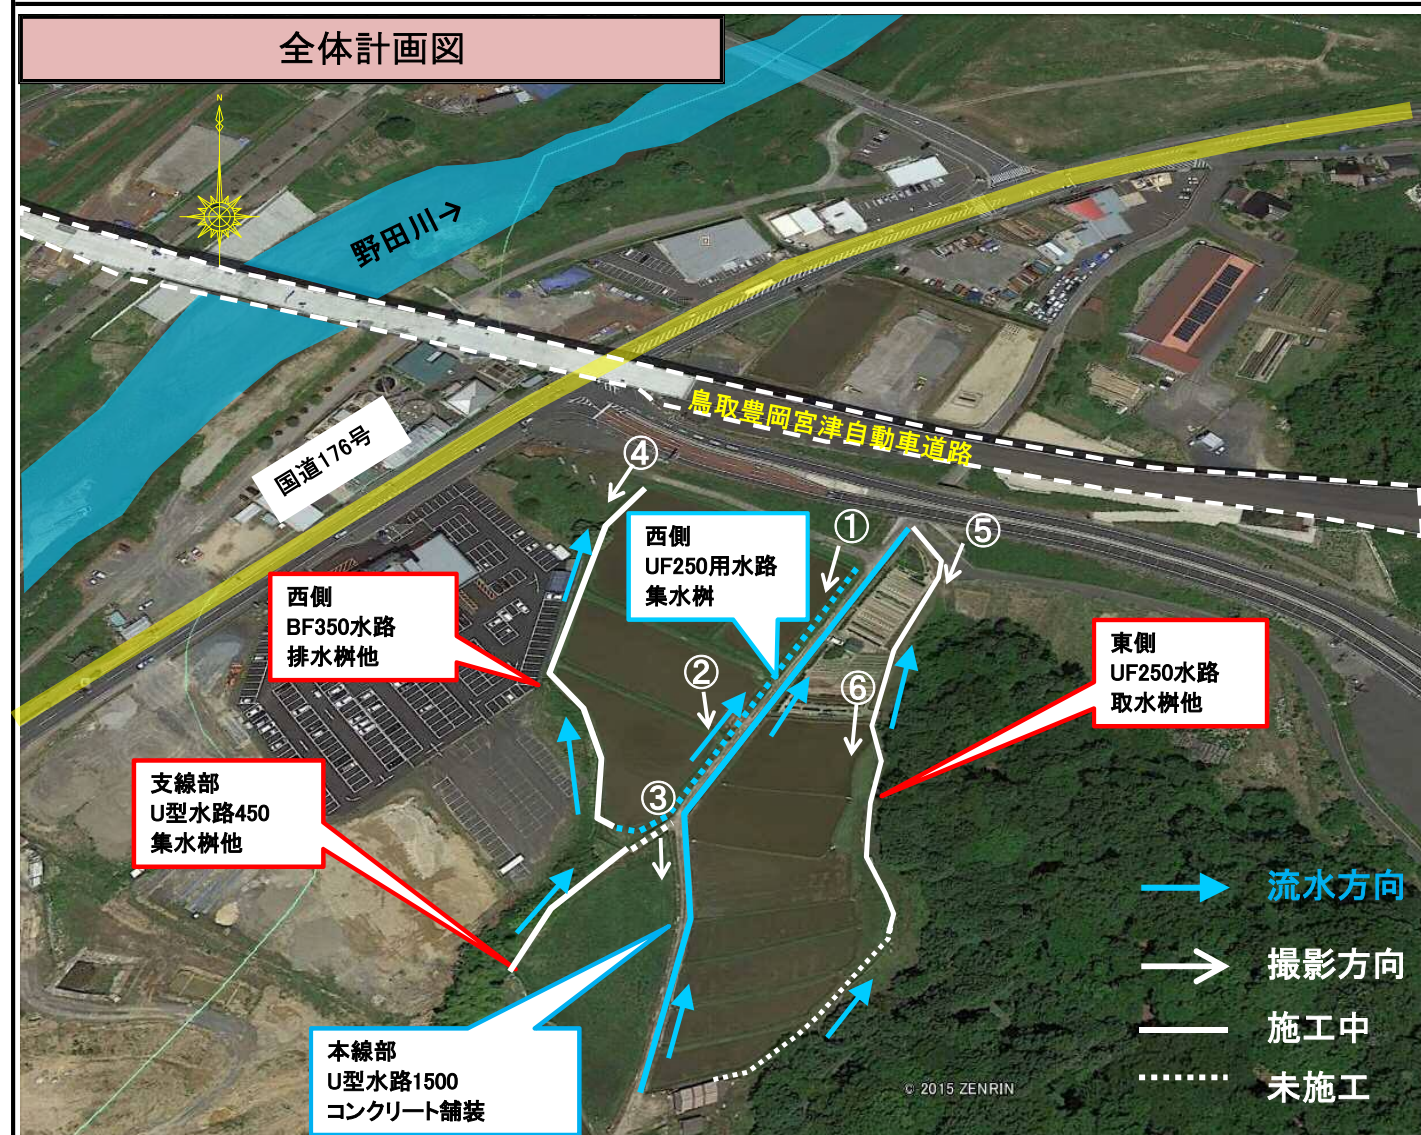

写真① 本線部:U形水路B1500



写真② 本線部:U形水路B1500



写真③ 本線部:U形水路B1500



写真④ 西側:BF-350(排水路)



写真⑤ 東側 用水路:UF250



写真⑥ 東側 用水路:UF250




平成28年4月末撮影

工事名	ごみ処理施設関連工事
工事場所	京都府宮津市字須津地内
工期	平成 27年 11月 26日 ～ 平成 28年 7月 29日
請負者	金下建設株式会社
現場代理人	吉岡 照雄
現場事務所	京都府宮津市字須津1676-1 金下建設(株) 須津事務所
TEL	0772-46-5680
FAX	0772-46-5681

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月
計画	29%	50%	91%	95%
実施	30%	52%	86%	

全体計画図

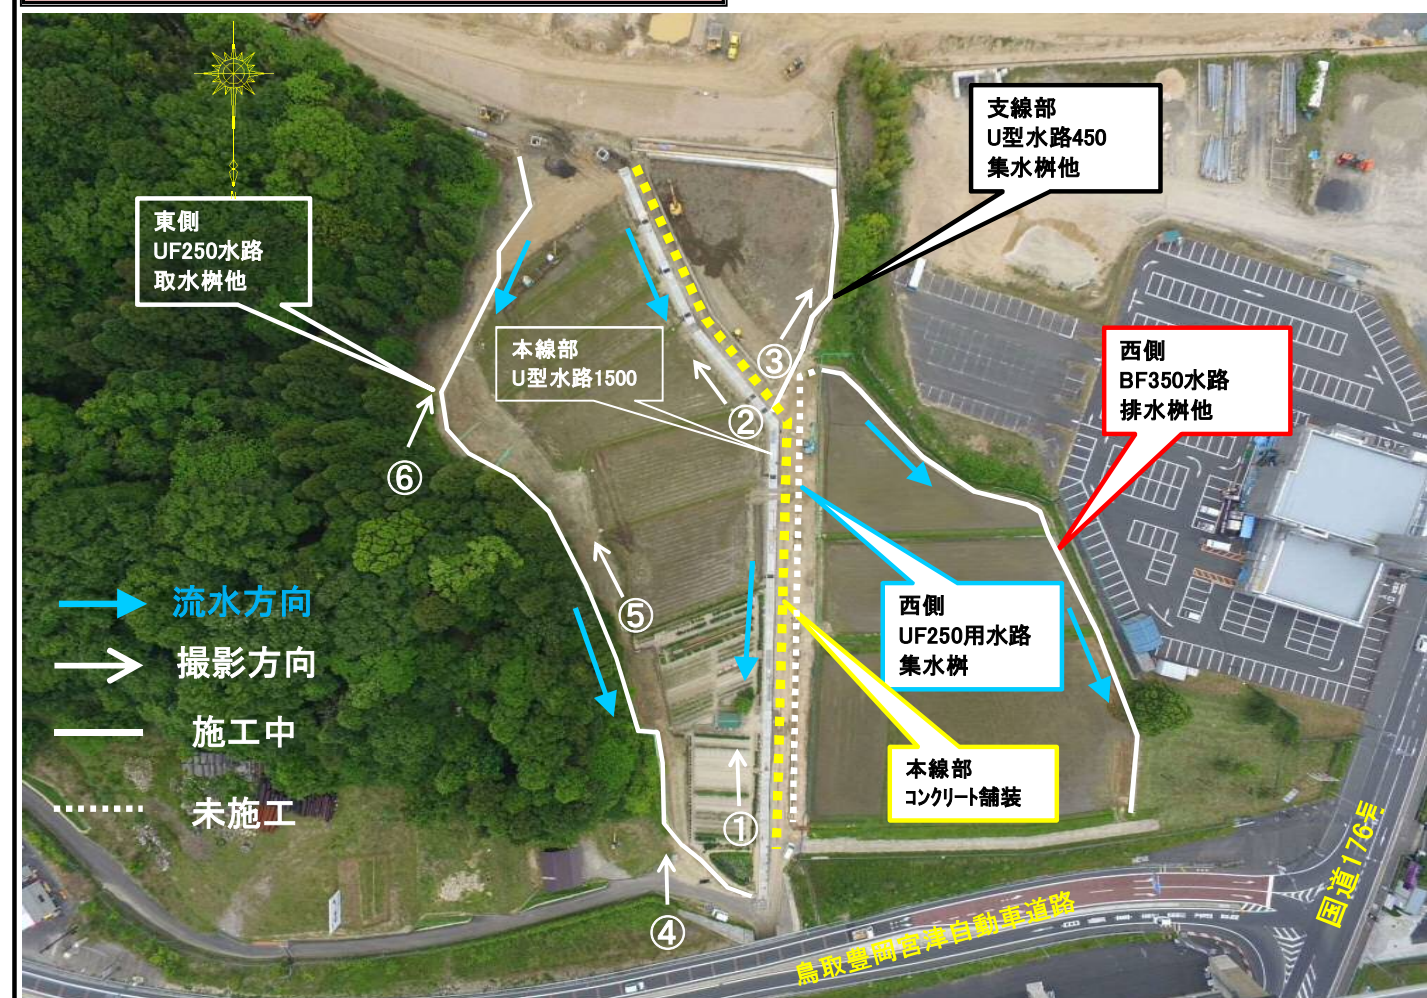

写真① 本線部:U形水路B1500



写真② 本線部:U形水路B1500



写真③ 支線部:PU1-450・集水樹



写真④ 東側 用水路:UF250



写真⑤ 東側 用水路:UF250




写真⑥ 東側 用水路:UF250



ごみ処理施設関連工事【工事進捗状況】

工事名	ごみ処理施設関連工事				
工事場所	京都府宮津市字須津地内				
工期	平成27年11月26日～平成28年7月29日				
請負者	金下建設株式会社				
現場代理人	吉岡 照雄				
現場事務所	京都府宮津市字須津1676-1 金下建設(株) 須津事務所				
TEL	0772-46-5680				
FAX	0772-46-5681				
【工事進捗率】					
	3月	4月	5月	6月	7月
計画	29%	50%	91%	95%	100%
実施	30%	52%	86%	94%	

全体計画図

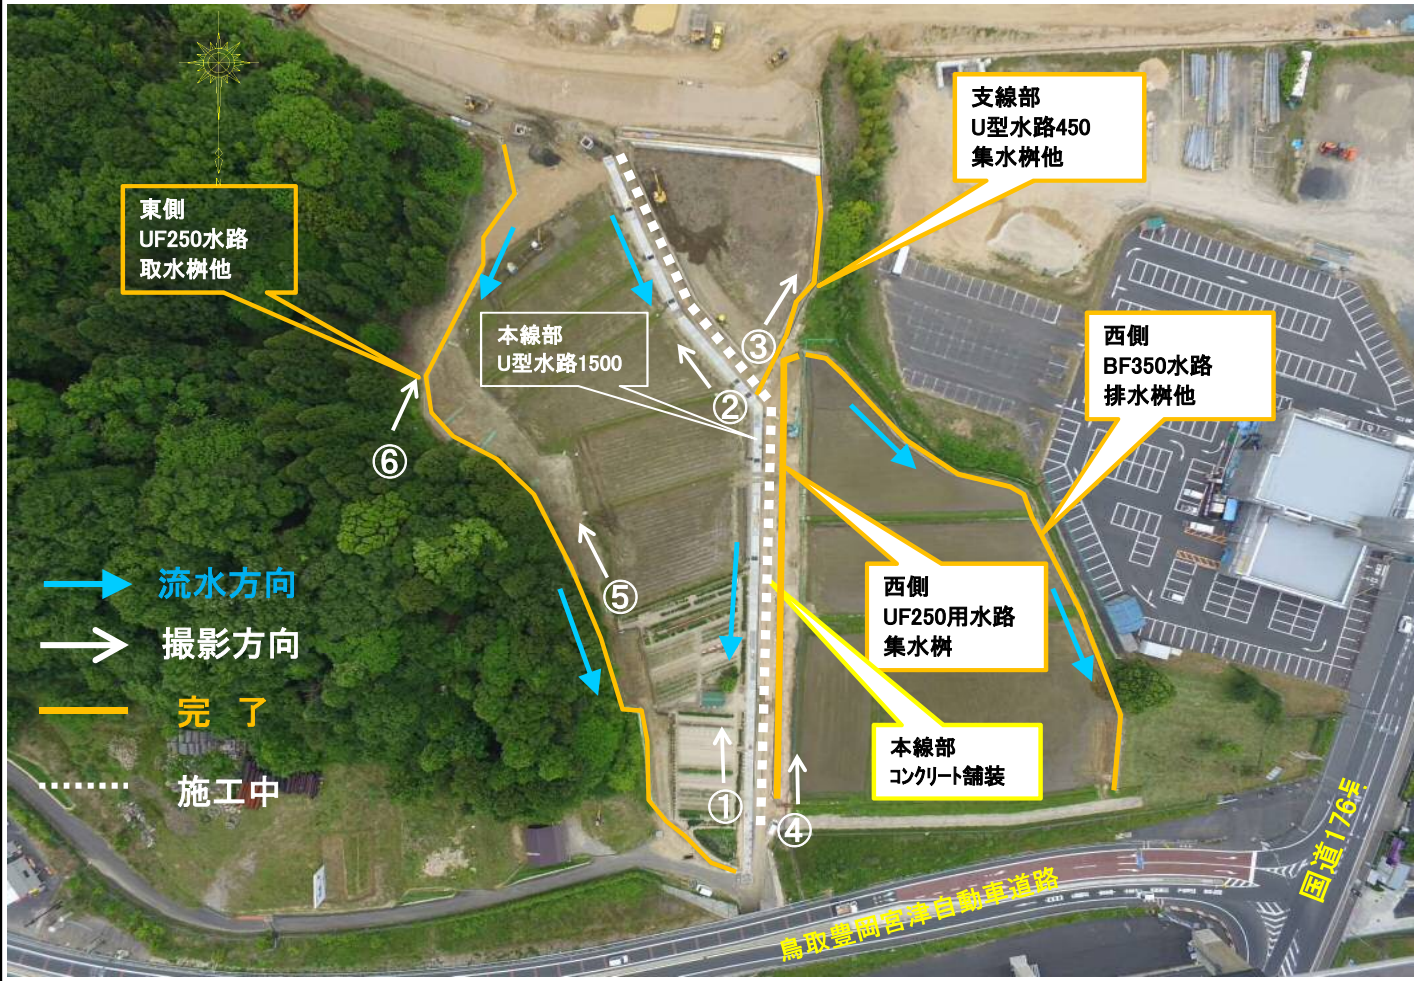

写真① 本線部:U形水路B1500



写真② 本線部:U形水路B1500



写真③ 支線部:PU1-450・集水樹



写真④ 西側 用水路:UF250



写真⑤ 東側 用水路:UF250



写真⑥ 東側 用水路:UF250



ごみ処理施設関連工事【工事進捗状況】

工事名	ごみ処理施設関連工事
工事場所	京都府宮津市字須津地内
工期	平成27年11月26日～平成28年7月29日
請負者	金下建設株式会社
現場代理人	吉岡 照雄
現場事務所	京都府宮津市字須津1676-1 金下建設(株) 須津事務所
TEL	0772-46-5680
FAX	0772-46-5681

【工事進捗率】	3月	4月	5月	6月	7月
計画	29%	50%	91%	95%	100%
実施	30%	52%	86%	94%	100%

全体計画図



写真① 本線部:No.0 施工前



写真① 本線部:No.0 完成



写真② 本線部:No.3 施工前



写真② 本線部:No.3 完成



写真③ 本線部:No.6 施工前



写真③ 本線部:No.6 完成

