


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成31年 7月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成29年12月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
12/ 1～12/29	[ごみピット土留め]	切梁腹起し2段目(12/1～5)、3段目(12/20～26)、安全仮設(12/29)
12/ 6～12/20	[ごみピット土工]	3次掘削
12/ 1～12/26	[残土搬出・処分]	掘削残土搬出－場外仮置き場集積。場外処分(累計：8500m³)。
12/ 1～12/28	[リサイクル棟 土工]	一般階基礎掘削、地階基礎埋戻し(12/21～23)
12/ 1～12/ 4	[リサイクル棟 基礎工事]	基礎配筋(地階部分)
12/ 5～12/ 9	[リサイクル棟 基礎工事]	基礎型枠(地階部分)
12/15	[リサイクル棟 基礎工事]	基礎コンクリート打設(地階部分)
12月末現在出来高 ： 6.6%		

状況写真撮影方向(H29年12月26日撮影)

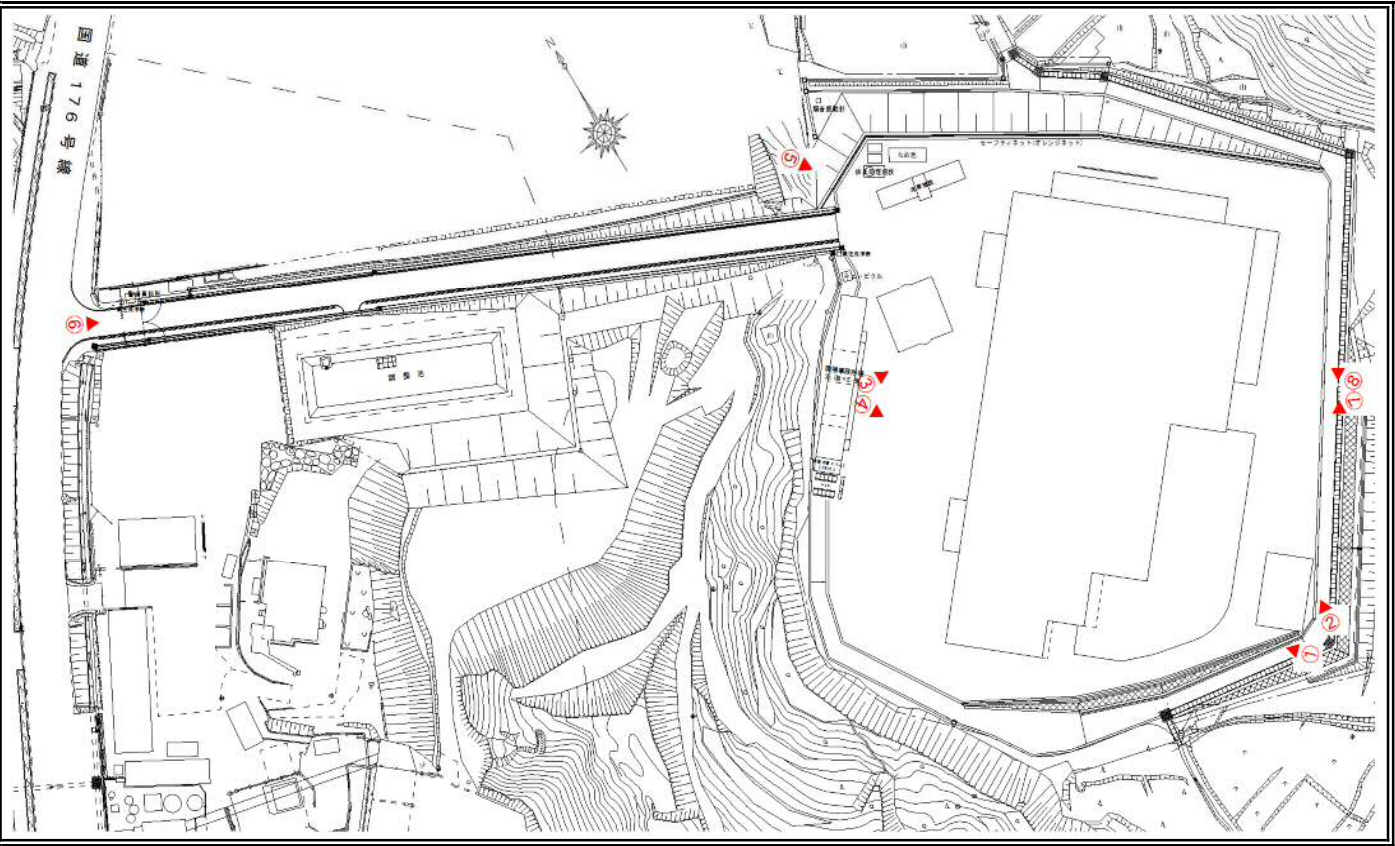

写真① 敷地西側全景(南角から)



写真② 敷地東側全景(南角から)



写真③ 敷地東側全景(事務所から)



写真④ 敷地西側全景(事務所から)



写真⑤ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ ごみピット 基礎掘削(3次)完了
〃 切梁・腹起し(3段目)設置作業中



写真⑧ リサイクル棟 基礎(地階部)基礎con完了
〃 (一般階)基礎掘削作業中
