

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年1月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事				
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内				
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日 (H30. 2月契約変更予定)				
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体				
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)				
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他				
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730	
F A X		0772-45-1733		0772-45-1731	


工事進捗状況

平成30年1月度の現場の作業状況は以下の通りです。

1/ 6～1/23	[ごみピット土工事]	地下ごみピット4次掘削作業
1/24～1/31	["]	降雪・積雪の為、掘削作業中止。ピット内除雪・排水等準備作業。
1/ 6～1/15	[リサイクル棟 基礎工事]	B1階耐圧版 基礎配筋・型枠組作業
1/17～1/22	[リサイクル棟 基礎工事]	鉄骨アンカーフレーム、ベースバック設置作業
1/19～1/30	[リサイクル棟 基礎工事]	基礎足場組立
1/24～1/31	[リサイクル棟 基礎工事]	一般階基礎配筋作業
1/16	[リサイクル棟 基礎工事]	B1階耐圧版コンクリート打設

1月末現在出来高 : 7.5%

状況写真撮影方向 (H30年2月5日撮影)

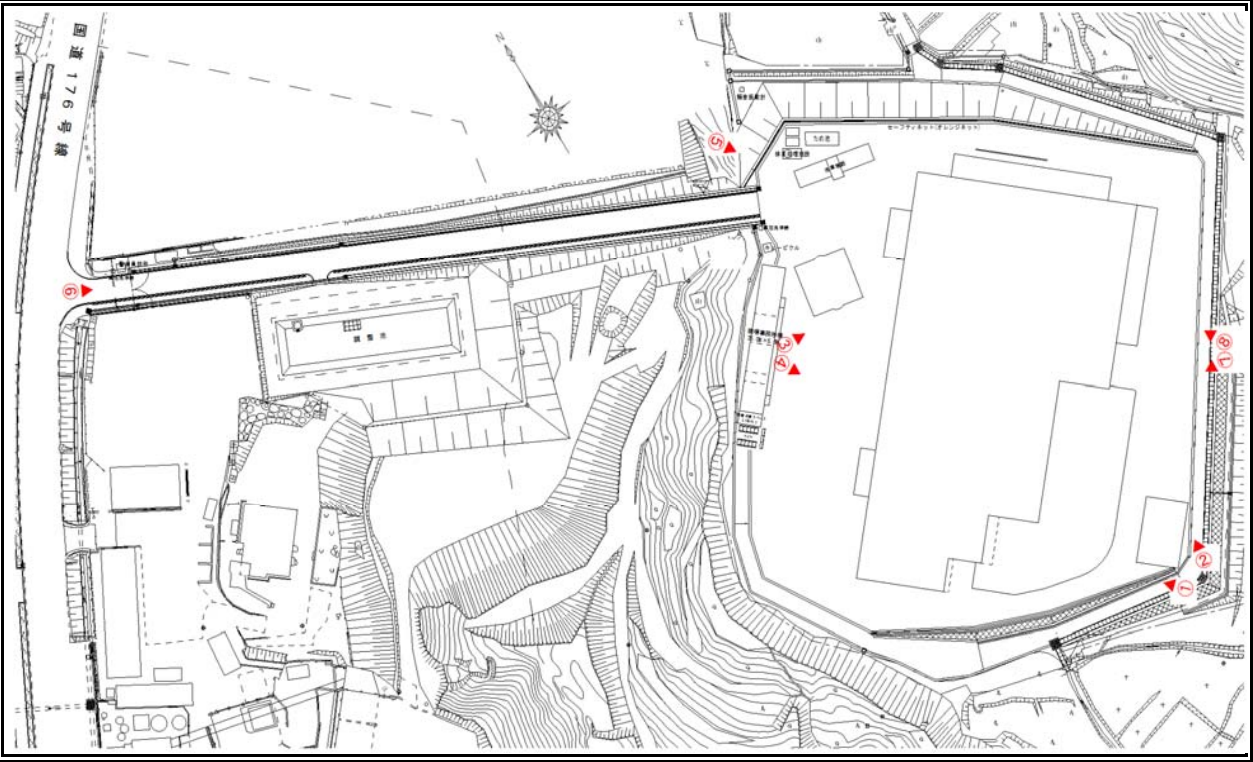

写真① 敷地西側全景 (南角から)



写真② 敷地東側全景 (南角から)



写真③ 敷地東側全景 (事務所から)



写真④ 敷地西側全景 (事務所から)



写真⑤ 進入路 (現場側) ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ ごみピット 基礎掘削 (4次) 作業中
" 床付成形作業中



写真⑧ リサイクル棟 基礎足場設置完了
" 基礎配筋・型枠組立作業中
