

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年6月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事		
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内		
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日		
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体		
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者: 近藤 克信)		
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他		
T E L	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730
F A X	0772-45-1733		0772-45-1731


工事進捗状況

平成30年6月度の現場の作業状況は以下の通りです。

6/1～6/22	[ごみピット 躯体工事]	B2階躯体、B1階スラブ 配筋・型枠組立、コンクリート打設 (6/19・21・22)
6/25～6/30	[ごみピット 躯体工事]	B2階躯体 型枠脱型作業
6/26～6/30	[ごみピット 防水工事]	B2階躯体 外周 セパ埋め、シール、塗膜防水
6/1～6/30	[屋外工事]	ガス貯留槽基礎下改良、助燃貯留槽埋戻、電気・設備埋設配管 他
6/26～6/27	[プラント工事(鉄回収)]	助燃油貯留槽据付
6/20～6/30	[プラント工事(リサイクル)]	各機器墨出し、アンカー打設、プラスチック製容器包装供給コンベヤ かん供給コンベヤ、不燃・粗大ごみ受入ホッパ・供給コンベヤ据付

6月末現在出来高 : 13.0%

状況写真撮影方向 (H30年6月30日撮影)

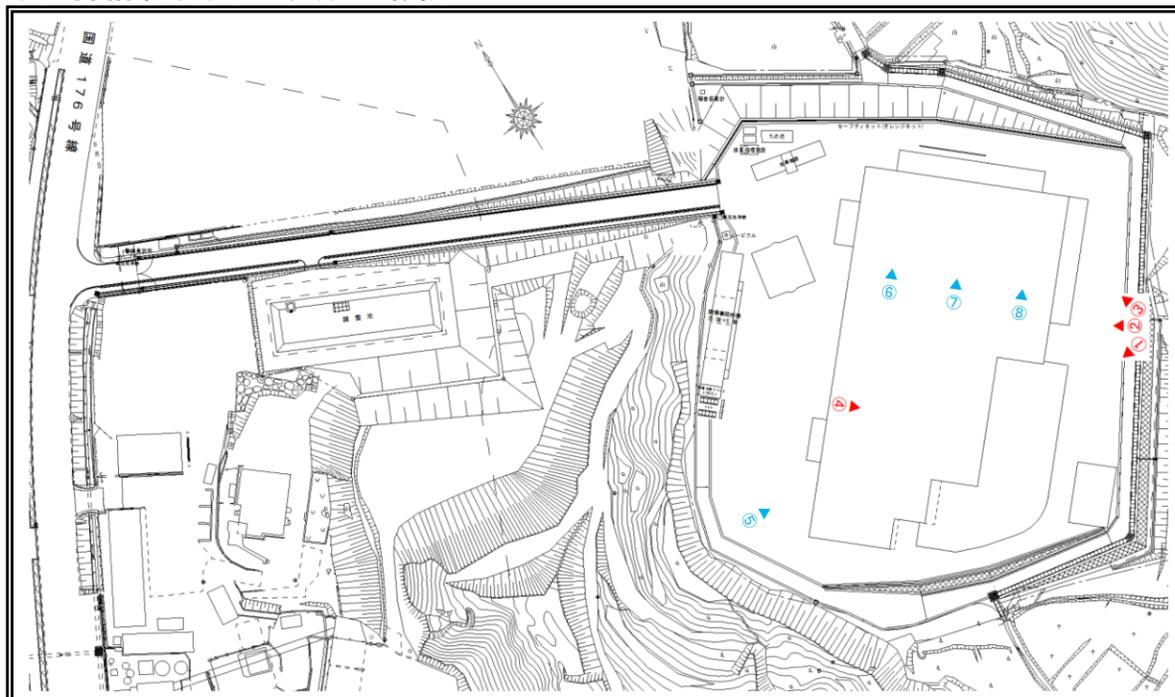

写真① 敷地南側全景(南東方向から)



写真② 敷地中央全景(南東方向から)



写真③ 敷地北側全景(南東方向から)



写真④ ごみピットB2階躯体・B1階スラブ CON打設完了



写真⑤ 助燃油貯留槽 据付完了



写真⑥ プラスチック製容器包装供給コンベヤ据付完了



写真⑦ かん供給コンベヤ据付完了



写真⑧ 不燃・粗大ごみ供給コンベヤ据付完了
