

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H31年4月度」工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成31年4月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
4/1～4/31	[リサイクルエリア ALC工事]	内外壁ALC下地、ALC建込、鉄骨貫通部が ード、内外壁左官補修。
4/15～4/31	[リサイクルエリア 屋根工事]	屋根ALC取付工事、折版屋根貼工事。
4/1～4/31	[リサイクルエリア その他]	耐火・防臭シール打設。鉄部塗装。各所サッシ取付。
4/1～4/31	[ごみピットエリア 躯体]	[～4/22] 4階・CG階配筋・型枠。[4/26～] B工区3階配筋・型枠。
4/6・23	[ごみピットエリア コンクリート]	[4/6]4階躯体コンクリート打設。[4/23]CG階躯体コンクリート打設。
4/1～4/31	[ごみピット他 防食塗装]	ごみピットエリア地階・各エリア各階各所防食塗装。
4/1～4/31	[プラットフォームエリア 各種工事]	外壁ALC下地、ALC建込。外壁左官補修。屋根折版貼工事。
4/1～4/31	[炉室エリア ALC工事]	内外壁ALC下地取付、ALC建込、目地シール。
4/1～4/31	[炉室エリア その他]	耐火・防臭シール打設。鉄部塗装。各所防食塗装。
4/1～4/31	[電気・設備]	リサイクルエリア：1・2階・B1階、ごみピットエリア：B1階配管・配線。
【4月末現在出来高（建築）：68.0% （全体）：38.9%】		

状況写真撮影方向（H31年4月26日撮影）

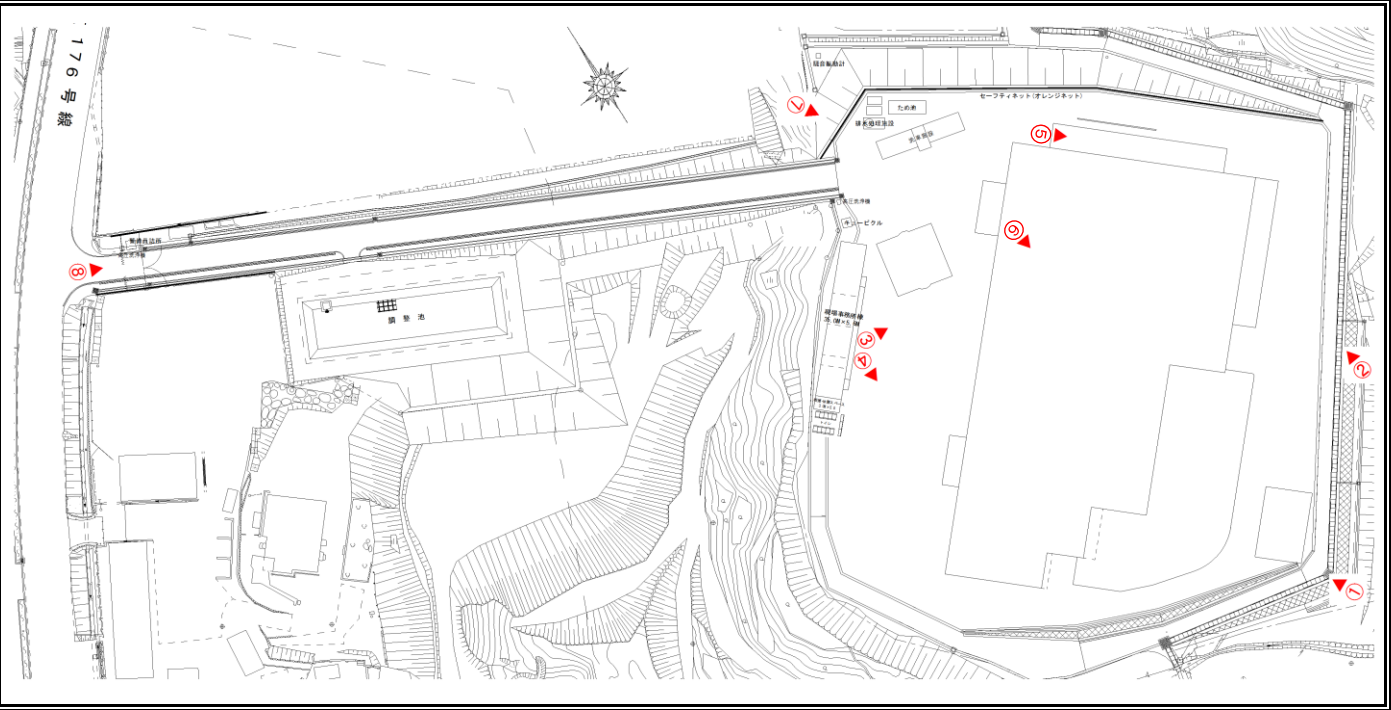

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(事務所から)



写真④ ごみピット・炉室エリア(事務所から)



写真⑤ リサイクルエリア 嵩上シダーコン・ワイメッシュ敷作業



写真⑥ リサイクルエリア・プラットフォームエリア 折版屋根貼作業



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

平成31年4月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
4/1～4/30	[リサイクル（機械選別室）]	機器据付(2FL～4FL)、ダクト据付
4/1～4/20	[エネ回収（薬品設備室）]	機器据付(1 FL)
4/1～4/27	[エネ回収（選別設備室）]	機器据付(1FL～3FL)
4/10～4/26	[エネ回収（ガス発電機室）]	機器据付(1FL)、ダクト据付
4/17～4/27	[エネ回収（有害ガス室）]	機器据付(1 FL～3FL)
4/22～4/30	[エネ回収（炉室）]	機器据付(1 FL)
4/29～4/30	[エネ回収（噴射水ポンプ室）]	機器据付(B2FL)
【4月末現在出来高（プラント）：9.8 % （全体）：38.9%】		

状況写真撮影位置

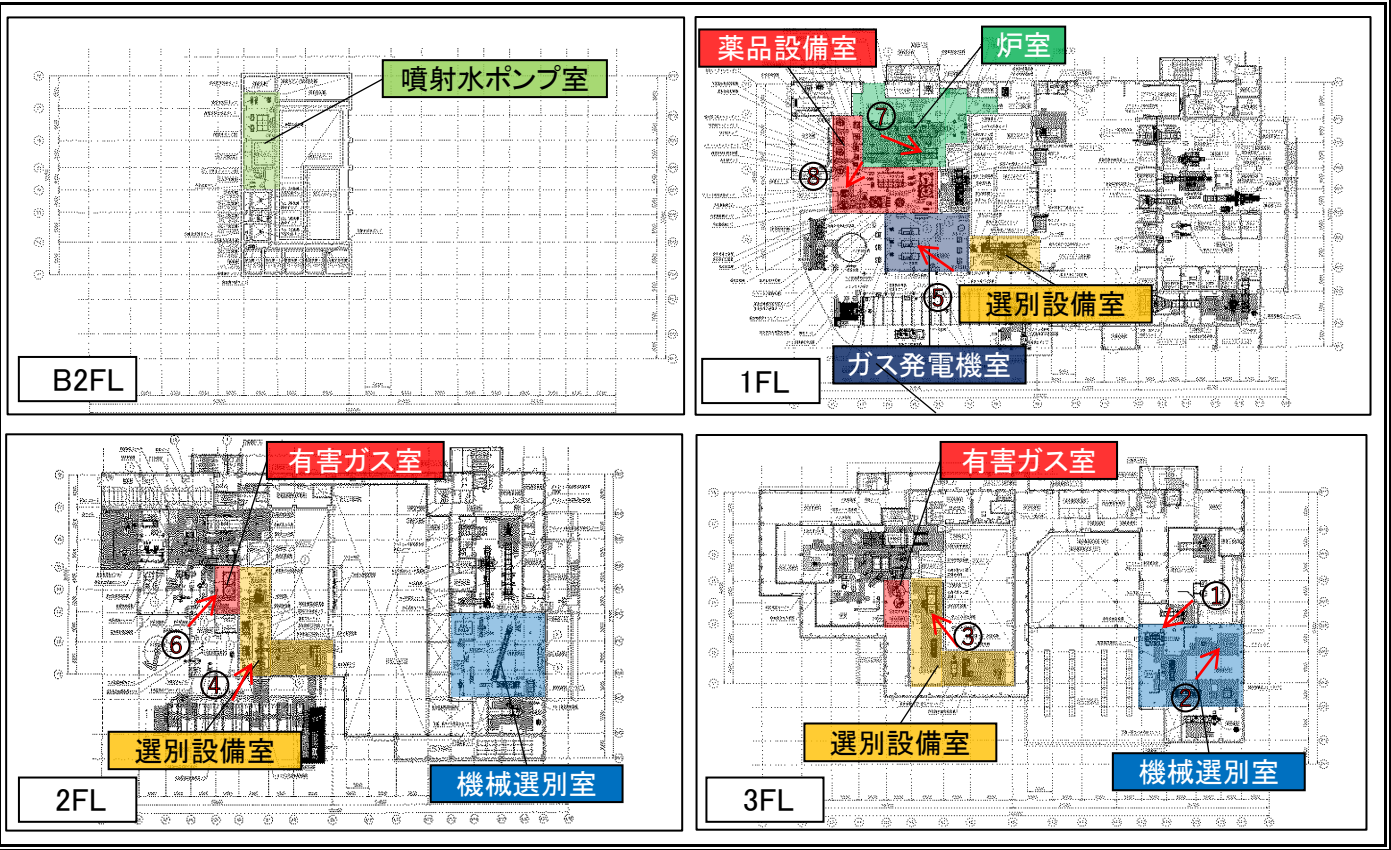

写真① 磁選機



写真② バグフィルタ



写真③ 受入ごみ切出装置



写真④ 選別ごみミキサー



写真⑤ ガス発電機



写真⑥ 消石灰貯留槽



写真⑦ 環境集じん装置



写真⑧ 汚泥濃縮槽(1)・(2)
