

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年6月度」工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和元年6月度の現場の作業状況は以下の通りです。			
6/10～6/30	[リサイクルエリア 躯体工事]	破砕機室 4階梁スラブ 躯体、屋上パレット躯体～Con打設。	
6/10～6/30	[リサイクルエリア 内装工事]	内装壁・天井下地組～ボード貼。	
6/24～6/30	[ごみピットエリア 躯体工事]	B工区4階 配筋・型枠建込。	
6/1～6/30	[各エリア 屋根工事]	リサイクル～プラットフォーム＝炉室エリア：ハイテールフ仕舞、4階庇屋根瓦棒葺き。	
6/1～6/30	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付。	
6/1～6/30	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し面セグ埋、目地払い、吹付下地補修。	
6/1～6/30	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。炉室～プラットフォーム(南面):外壁吹付。	
6/10～6/30	[車庫棟 土・基礎工事]	基礎掘削～基礎配筋～基礎型枠工事	
6/19～6/30	[外構 北面擁壁]	U字溝撤去・仮置、掘削～捨コン打設	
6/1～6/30	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。	
【6月末現在出来高（建築）：76.0％ （全体）：49.4％】			

状況写真撮影方向（令和元年7月1日撮影）

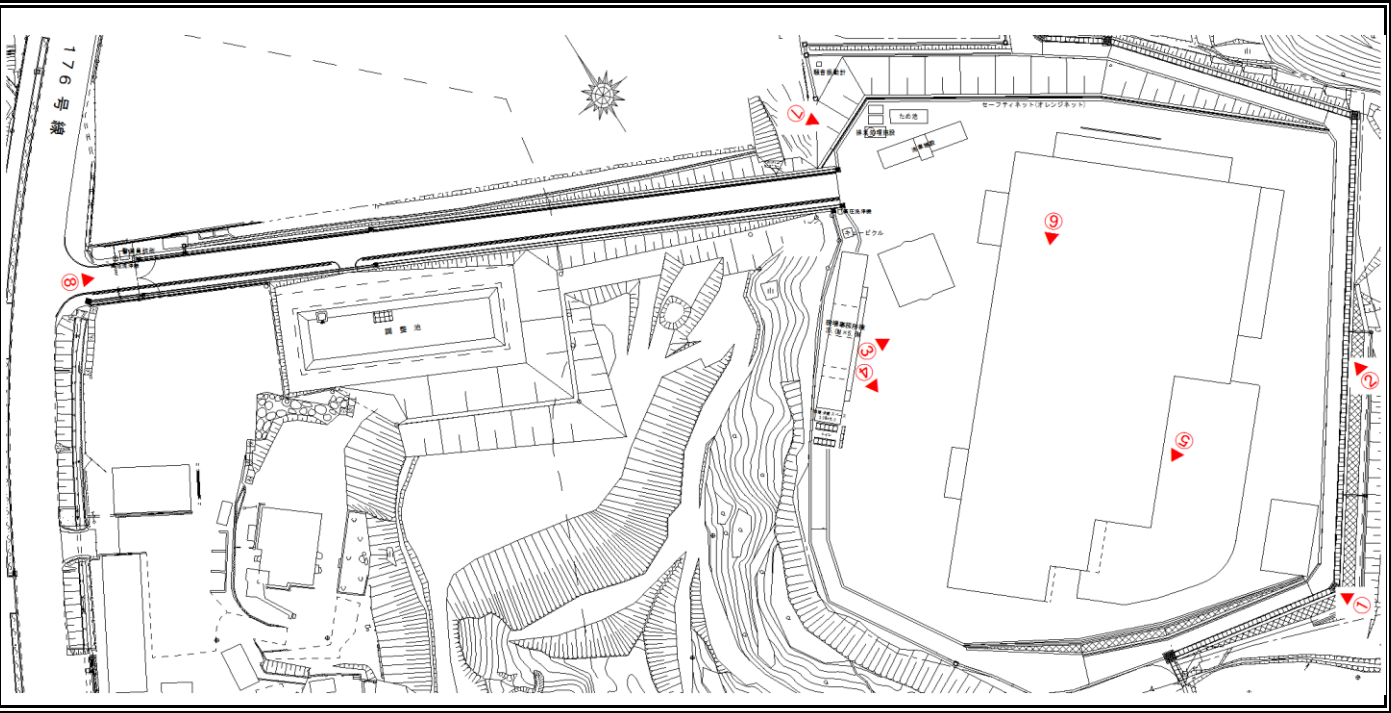

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(事務所から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(事務所から)



写真⑤ 炉室～プラットフォームエリア 外壁吹付



写真⑥ リサイクルエリア 内装間仕切り下地・ボード貼



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年6月度」プラント工事工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年6月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
6/1	[リサイクル（破砕機室）]	機器据付まとめ
6/1～6/30	[エネ回収（炉室）]	架台・歩廊組立、機器据付(2FL～3FL)、ダクト組立
6/1～6/15	[エネ回収（灰出し設備室）]	歩廊据付、機器据付(2.5FL～3FL)
6/3～6/19	[エネ回収（ホッパエリア）]	機器据付（4FL）
6/13～6/22	[エネ回収（選別設備室）]	歩廊仕舞まとめ(2FL～3FL)
6/14～6/16	[エネ回収（地下エリア）]	機器据付(B1FL)
6/10～6/30	配管工事	エネ回収（B2FL～1FL）サポート・配管敷設
6/3～6/30	電気工事	リサ（1FL～2FL）ケーブルラック・電線管・現操盤・計装機器取付
【6月末現在出来高（プラント）：22.7% （全体）：49.4%】		

状況写真撮影位置

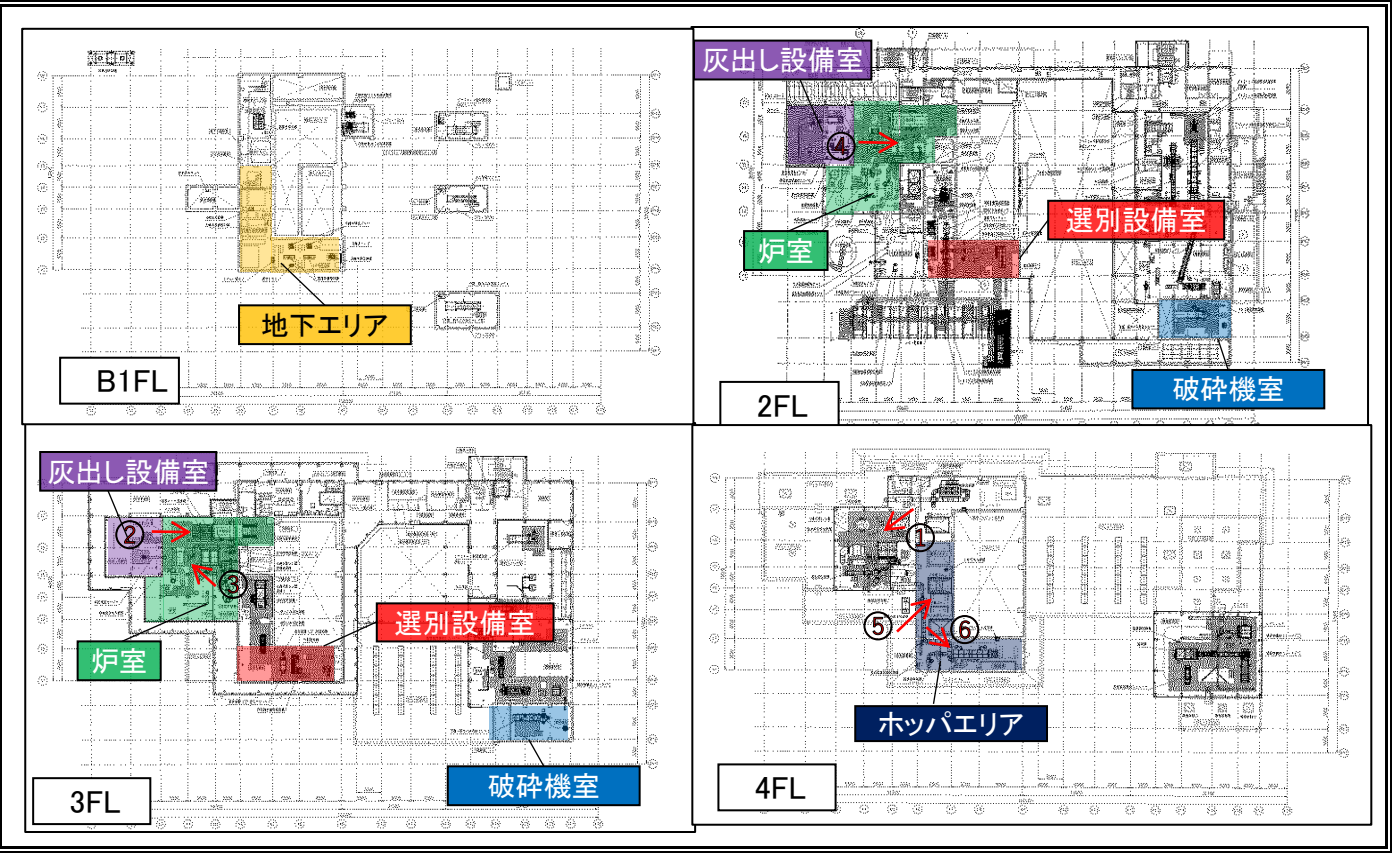

写真① 焼却炉歩廊



写真② 乾燥ストーカ、燃焼・後燃焼ストーカ



写真③ 空気予熱器



写真④ 空気ダクト




写真⑤ ごみ受入ホッパ



写真⑥ 湿式脱臭装置



写真⑦ ケーブルラック、配管サポート

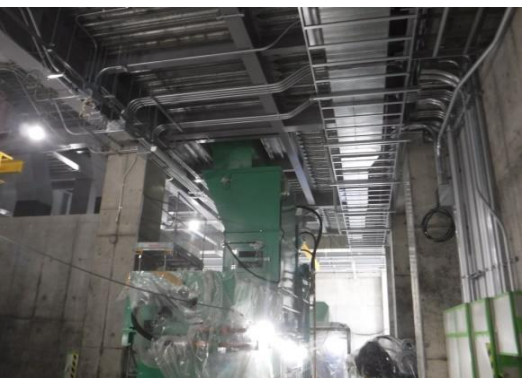

写真⑧ ケーブルラック
