

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年10月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者: 近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730
F A X		0772-45-1733		0772-45-1731


工事進捗状況

平成30年10月度の現場の作業状況は以下の通りです。

10/1～10/31	[リサイクルエリア 鉄筋・型枠]	1階柱・壁・2階梁・スラブ・3階スラブ 配筋。1階柱・壁・2階梁型枠組立。
10/1～10/31	[リサイクルエリア 型枠脱型]	1階柱・壁・2階梁型枠脱型。
10/12・23	[リサイクルエリア コンクリート打設]	1階柱・壁・2階梁コンクリート打設(②工区: 10/12・③工区: 10/23)。
10/1～10/13	[プラットフォームエリア 鉄骨]	鉄骨建て方～仕舞。
10/8～10/29	[プラットフォームエリア 基礎]	基礎(掘削: 10/8～12・鉄筋型枠: 10/13～26・CON打設: 10/29)
10/24～10/31	[ごみピットエリア 鉄骨]	鉄骨建て方(前半分)。
10/1～10/20	[炉室エリア 基礎]	基礎(鉄筋型枠: 10/1～10・CON打設: 10/11・埋戻し10/16～20)
10/23～10/31	[炉室エリア プラント工事]	選別ごみ搬送コンベヤ、選別ごみ磁選機、破碎選別機歩廊架台 据付

【10月末現在出来高 : 20.6%】

状況写真撮影方向 (H30年10月27日撮影)

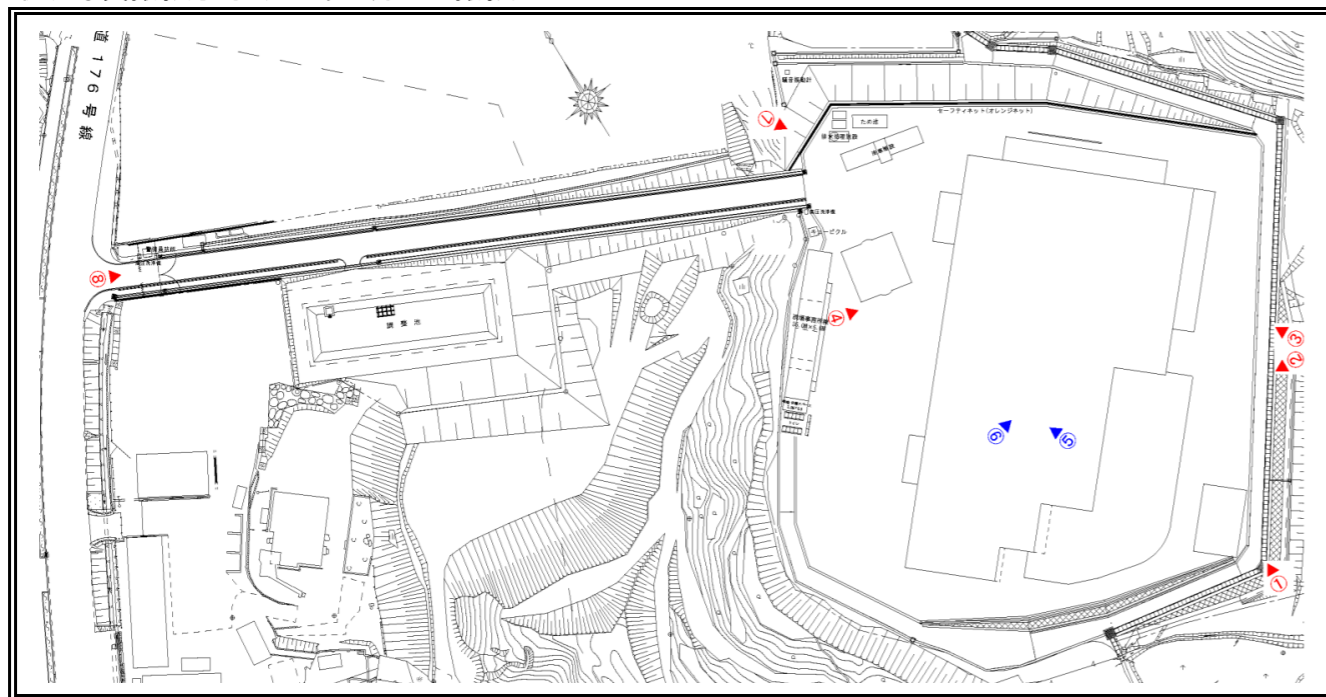

写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真④ プラットホーム・リサイクルエリア(事務所から)



写真⑤ 選別ごみ搬送コンベヤ



写真⑥ 選別ごみ磁選機



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年11月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工事名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工期	平成28年 4月22日～平成32年 6月30日			
請負者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現場代理人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現場事務所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
TEL	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730
FAX		0772-45-1733		0772-45-1731


工事進捗状況

平成30年11月度の現場の作業状況は以下の通りです。

- 11/1～11/30 [リサイクルエリア 鉄筋・型枠] 2・3階柱・壁・スラブ 配筋、1・2・3階柱・壁型枠組立
- 11/2・10・14 [リサイクルエリア コンクリート打設] コンクリート打設(1階④工区：11/2、3階スラブ：11/10、2階躯体：11/14)
- 11/1～11/13 [プラットフォームエリア 土間] 埋戻し・土間配筋、土間スラブ Con打設：11/13
- 11/5～11/30 [ごみピットエリア 鉄筋] 1階躯体配筋
- 11/21～11/30 [ごみピットエリア 鉄筋] 1階躯体型枠建込
- 11/3～11/30 [炉室エリア 鉄骨] 鉄骨建て方～仕舞
- 11/1～11/30 [電気・設備] 各エリア インサート・スリーブ 仕込み

【11月末現在出来高：22.7%】

状況写真撮影方向 (H30年11月27日撮影)

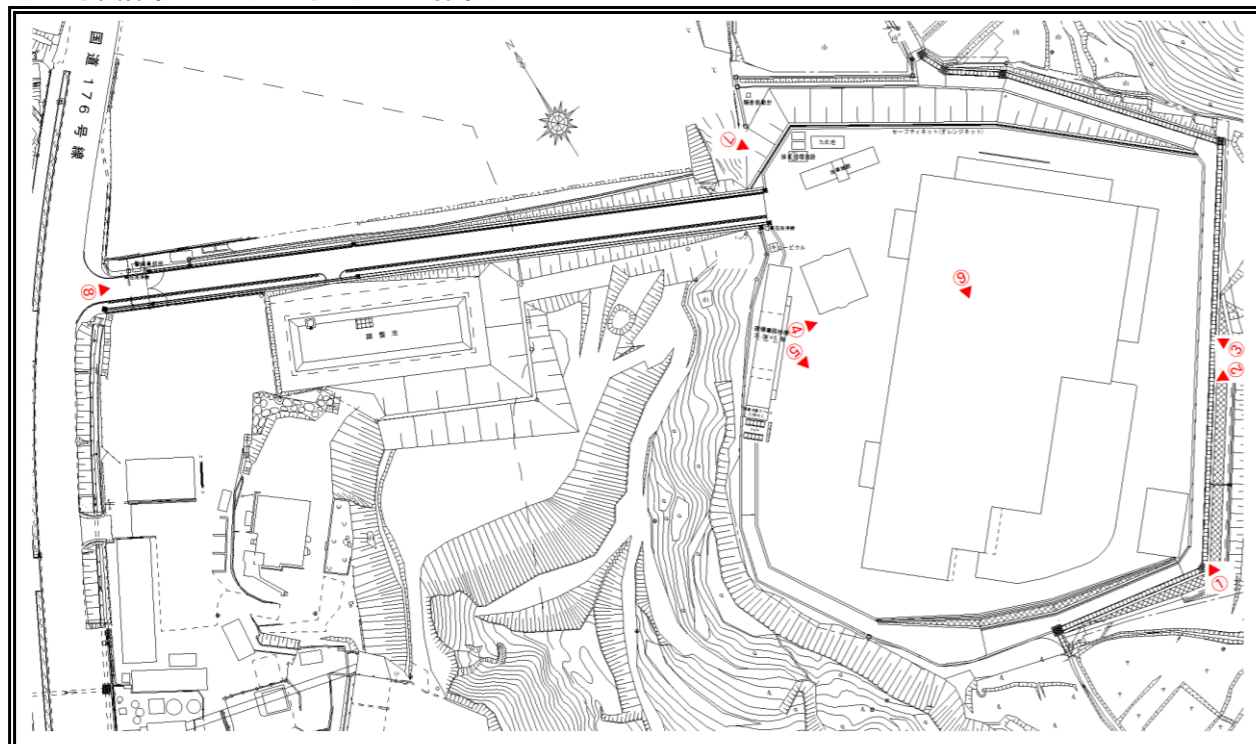

写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)




写真④ プラットホーム・リサイクルエリア(事務所から)



写真⑤ ごみピットエリア・炉室エリア



写真⑥ ごみピットエリア 1階躯体配筋・型枠建込

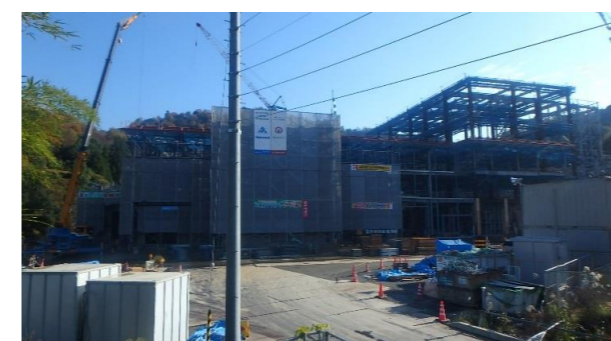

写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年12月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事					
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内					
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 6月30日					
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体					
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者: 近藤 克信)					
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他					
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730		
F A X		0772-45-1733		0772-45-1731		


工事進捗状況

平成30年12月度の現場の作業状況は以下の通りです。

12/1～12/8	[リサイクルエリア 鉄筋・型枠]	3階破碎機室躯体、階段室、2・3階プラットフォーム配筋・枠組立。
12/1・12/11	[リサイクルエリア コンクリート打設]	コンクリート打設(階段室・プラットフォーム: 12/1。3階破碎機室躯体: 12/11)
12/1～12/19	[リサイクルエリア ALC工事]	内外壁ALC下地取付、ALC建込。
12/1～12/19	[ごみピットエリア 鉄筋]	1階躯体・2階スラブ配筋。3階先行梁配筋。
12/1～12/19	[ごみピットエリア 型枠]	1階躯体・2階スラブ型枠建込。
12/1～12/19	[炉室エリア 鉄筋・型枠・コン]	1階スラブ配筋、1階腰壁配筋・型枠建込。1階スラブコン打設: 12/4。
12/1～12/19	[電気・設備]	各エリア: インサート・スリーブ仕込み。ごみピットエリア: B1階配管・配線

【12月末現在出来高(見込): 25.5%】

状況写真撮影方向 (H30年12月15日撮影)

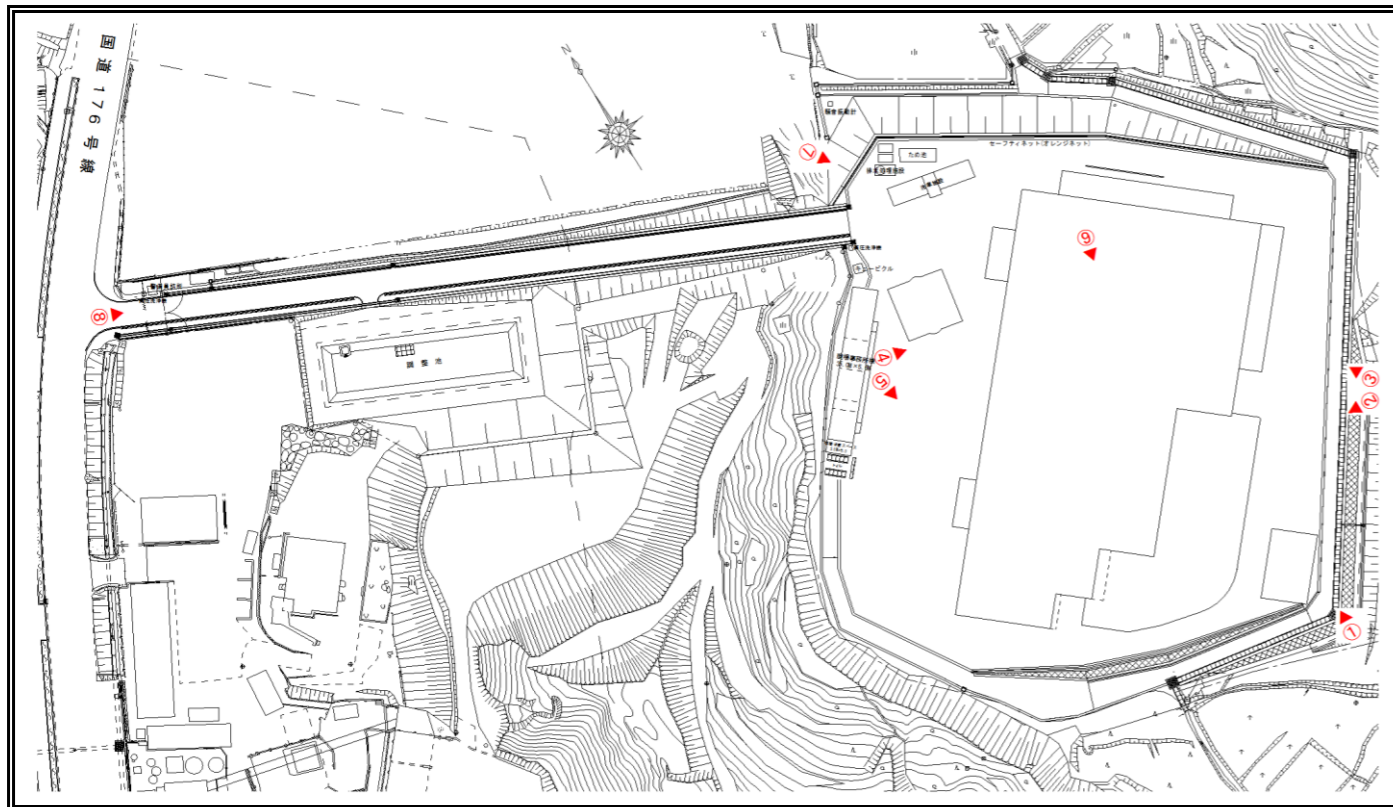

写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみピットプラットフォーム(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真④ プラットホーム・リサイクルエリア(事務所から)



写真⑤ ごみピットエリア・炉室エリア



写真⑥ リサイクルエリア 内外壁ALC下地・建込



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計
