

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年7月度」 工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和元年7月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
7/1～7/31	[リサイクルエリア 内装工事]	内装壁・天井下地組～ボート貼。
7/1～7/31	[ごみピットエリア 躯体工事]	B工区4階 配筋・型枠建込～Con打設。全工区CG階 配筋・型枠建込。
7/1～7/31	[各エリア 屋根工事]	各エリア：ハイツルーフ仕舞、トップライト取付。
7/1～7/31	[各エリア 吹付工事]	各エリア：外壁吹付・塗装。
7/1～7/31	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付。
7/1～7/31	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し面が埋、目地払い、吹付下地補修。
7/1～7/31	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。プラットフォーム(高所):鉄部塗装。
7/1～7/31	[車庫棟 躯体工事]	基礎Con打設～埋戻し・土間配筋・止め型枠・土間Con打設。
7/1～7/20	[外構 北面擁壁]	擁壁型枠～擁壁Con打設～埋戻し～U字溝復旧。
7/1～7/31	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。
【7月末現在出来高（建築）：80.0% （全体）：56.3%】		

状況写真撮影方向（令和元年7月30日撮影）

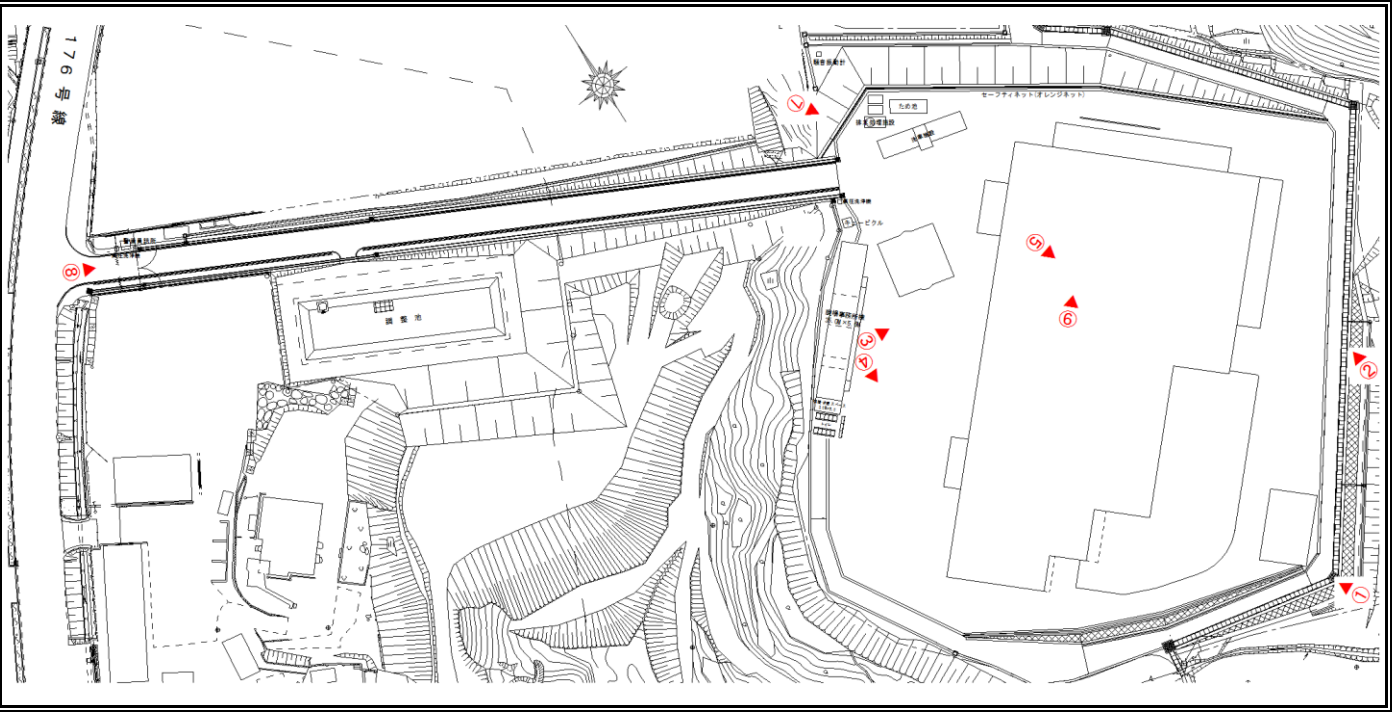

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ プラットホームエリア トップライト取付完了



写真⑥ リサイクルエリア 内装間仕切り下地・ボード貼



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年7月度」プラント工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年7月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
7/1～7/31	〔エネ回収（炉室）〕	架台・歩廊組立、機器据付(4FL～4FL+6100)、ダクト組立
7/6～7/10	〔エネ回収（地下エリア）〕	機器据付(B2FL)
7/6～7/19	〔エネ回収（薬品設備室）〕	機器据付(1FL)
7/1～7/31	配管工事	エネ回収（B2FL～1FL）・プラットホーム サポート・配管敷設
7/1～7/31	電気工事	エネ回収（1FL）・リサ（1FL～2FL）・プラットホーム
		ケーブルラック・電線管取付、各所現操盤・計装機器取付
		電気室等 高圧盤据付
【7月末現在出来高（プラント）： 32.5 % （全体）： 56.3%】		

状況写真撮影位置

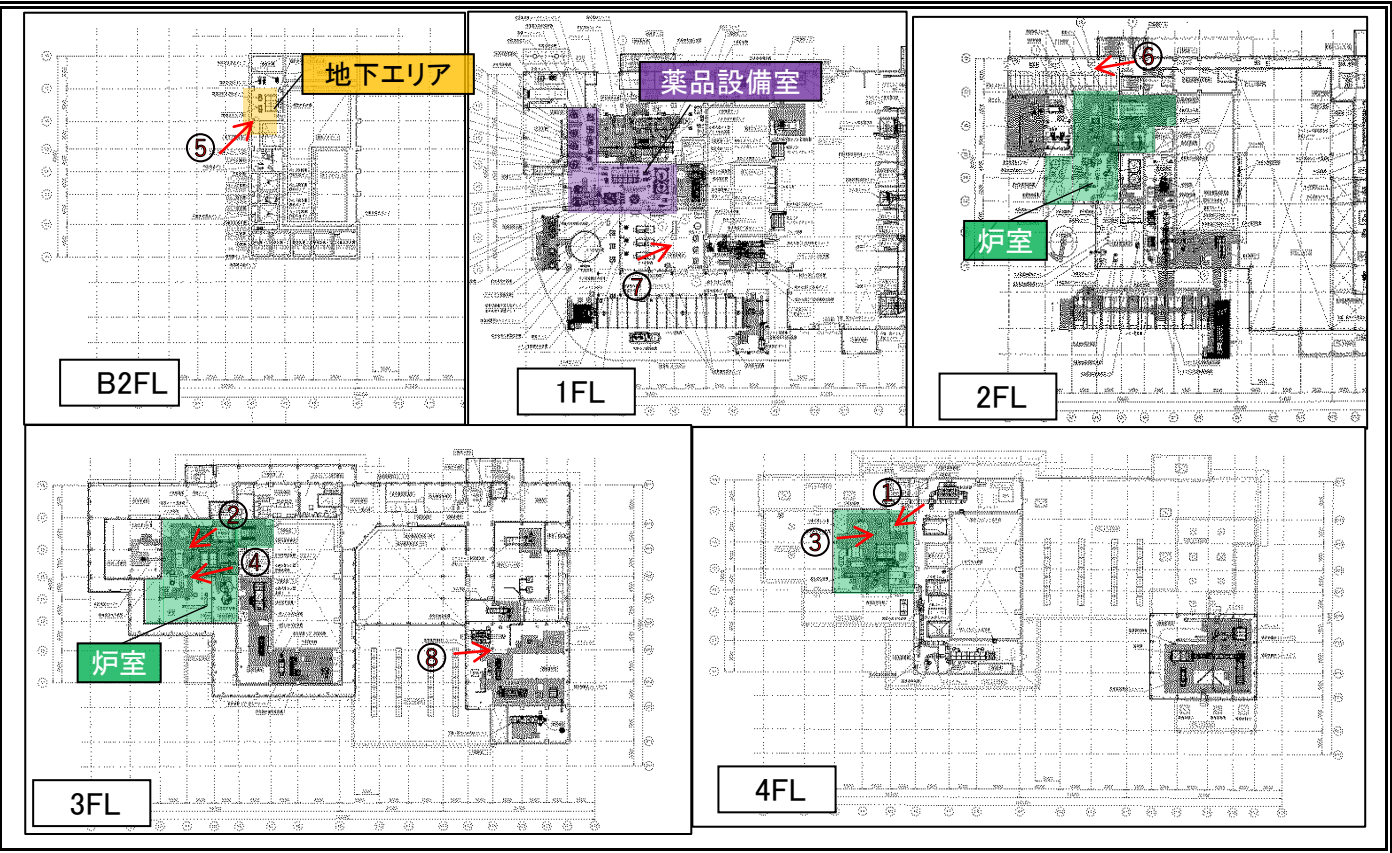

写真① 焼却炉架台・歩廊



写真② 空気予熱器



写真③ 炉フレーム・ケーシング



写真④ 空気ダクト




写真⑤ 機器冷却水槽



写真⑥ 電気室高圧盤



写真⑦ ケーブルラック、配管・サポート 敷設

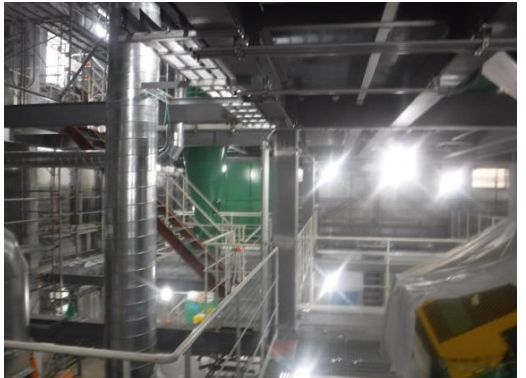

写真⑧ ケーブルラック・電線管 敷設
