


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和元年10月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
10/1～10/31	[ごみピットエリア 躯体工事]	最終工区CG階 配筋・型枠～Con打設。
10/1～10/31	[各エリア 内装工事]	内装壁・天井下地組～ボード貼。OA707施工。
10/1～10/31	[各エリア 吹付工事]	各エリア：外壁吹付・塗装。
10/1～10/31	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付。
10/1～10/31	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し面が埋、目地払い、吹付下地補修。
10/1～10/31	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
10/1～10/31	[ガス貯留槽 基礎工事]	基礎配筋・型枠～基礎・機械基礎・側溝・土間Con打設。
10/1～10/31	[計量棟 基礎工事]	基礎掘削～配筋・型枠～ベースCon～基礎型枠 11/7基礎Con予定
10/1～10/31	[外構 埋設配管]	北側 電気幹線・設備給排水埋設配管。
10/1～10/31	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。
【10月末現在出来高（建築）：88.0% （全体）：72.5%】		

状況写真撮影方向（令和元年10月28日撮影）

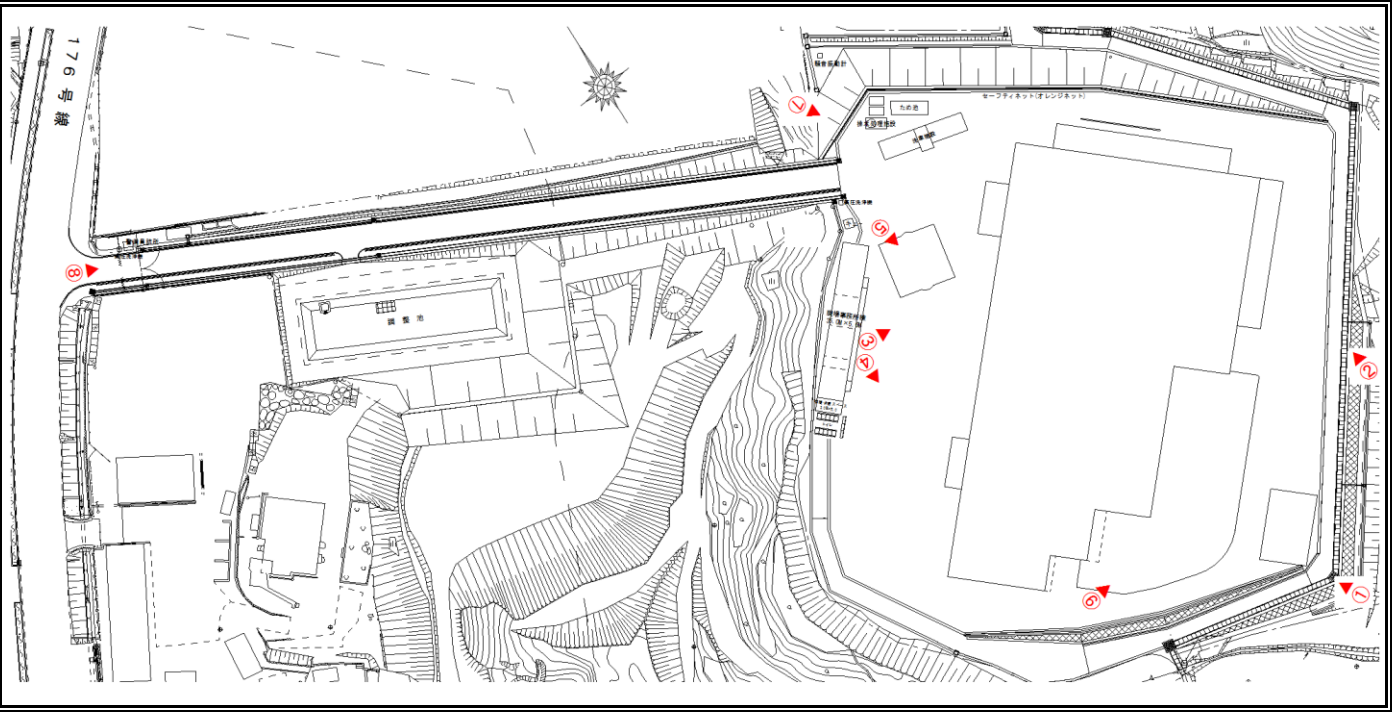

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ 計量棟 基礎施工状況



写真⑥ ガス貯留槽・メタン発酵槽施工状況



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年10月度の現場の作業状況は以下の通りです。					
10/1～10/31	【エネ回収（炉室）】	機器据付（2FL～3FL）、各所溶接仕舞			
10/1～10/25	【エネ回収（ホッパエリア）】	ダクト組立	10/28～10/31	【リサ（プラットホーム）】	ダクト組立
10/1～10/31	【エネ回収（屋外）】	メタン発酵槽周り架台建方、メタン発酵槽据付			
10/1～10/31	配管工事	エネ回収(B2FL～3FL)、プラットホームサポ-ト・配管敷設			
10/1～10/31	電気工事	エネ回収(1FL～4FL)、リサ(1FL～2FL)、プラットホームケーブルラック・電線管取付			
		エネ回収(1FL～4FL)、リサ(1FL～2FL)、プラットホームケーブル敷設			
10/28～10/31	築炉工事	アンカー取付			
10/1～10/31	保温工事	炉室板金材取付	10/28～10/31	塗装工事	リサ(2FL) 塗装
【10月末現在出来高（プラント）：57.0 % （全体）：72.5%】					

状況写真撮影位置

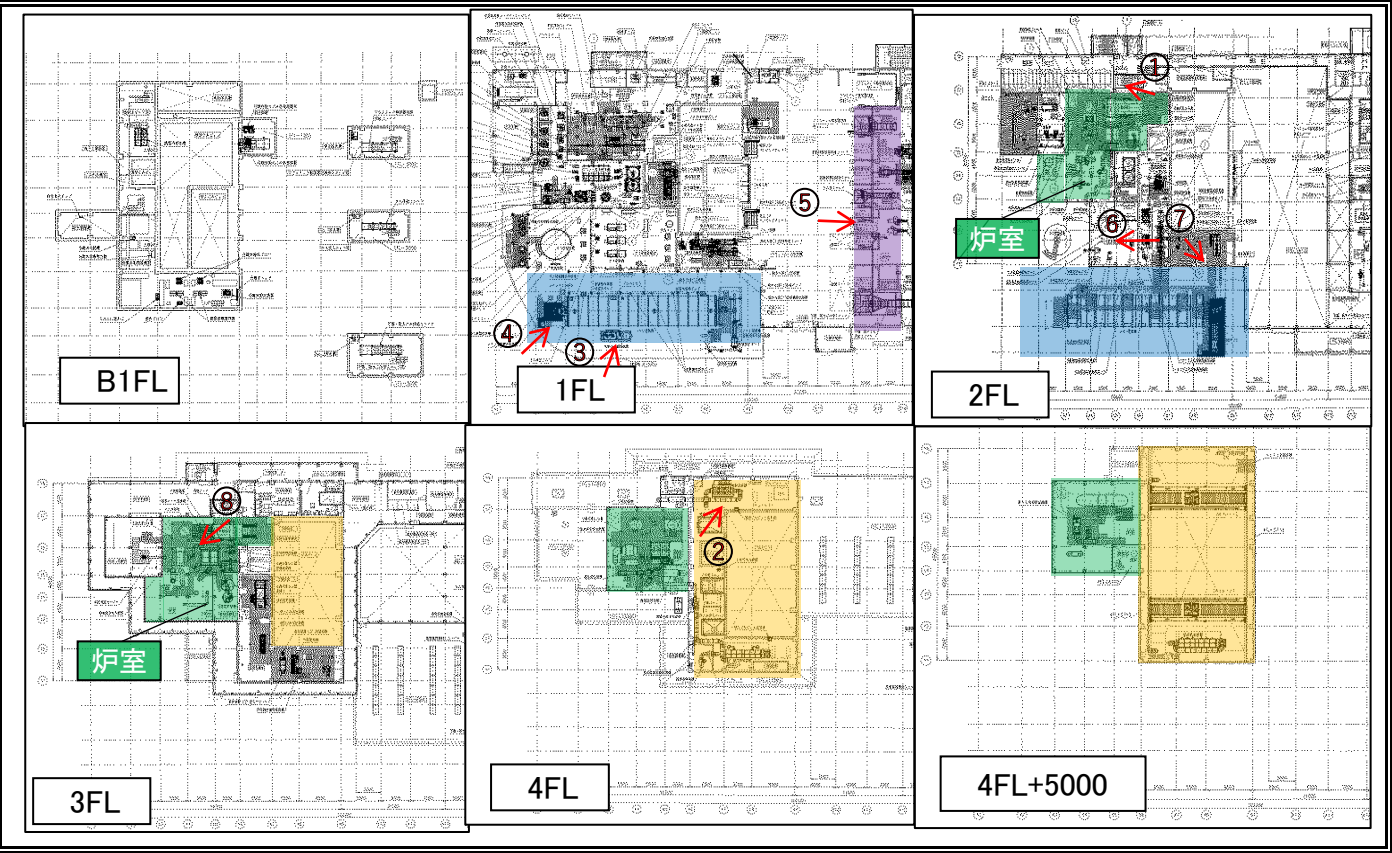

写真① エアシャワー



写真② 脱臭ダクト



写真③ 余剰ガス燃焼装置



写真④ メタン発酵槽



写真⑤ ダクト（リサイクル）



写真⑥ 配管・サポート 敷設



写真⑦ 配管・電線管 敷設



写真⑧ 保温材取付
