


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730
F A X		0772-45-1733		0772-45-1731

工事進捗状況

令和元年11月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
11/1～11/30	[ごみピットエリア 各種工事]	屋根ALC内部シール・鉄骨梁塗装・電気配線、器具付け
11/1～11/30	[各エリア 内装工事]	内装壁・天井下地組～ボード貼～クロス貼。OAフロア施工～床材貼。
11/1～11/30	[各エリア 吹付工事]	各エリア：外壁吹付・塗装。
11/1～11/30	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付。
11/1～11/30	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し面がけ埋、目地払い、吹付下地補修。
11/1～11/30	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
11/1～11/30	[煙突工事]	外壁サイディング貼～足場解体。内筒吊込み設置完了～溶接作業。
11/1～11/30	[計量棟 基礎工事]	基礎Con打設完了～脱型～埋戻し。11/27～鉄骨建て方開始。
11/1～11/30	[外構 埋設配管]	北側各所 電気幹線・設備給排水埋設配管。
11/1～11/30	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。外構：仕込み配管。
【11月末現在出来高（建築）：90.0% （全体）：79.1%】		

状況写真撮影方向（令和元年11月27日撮影）

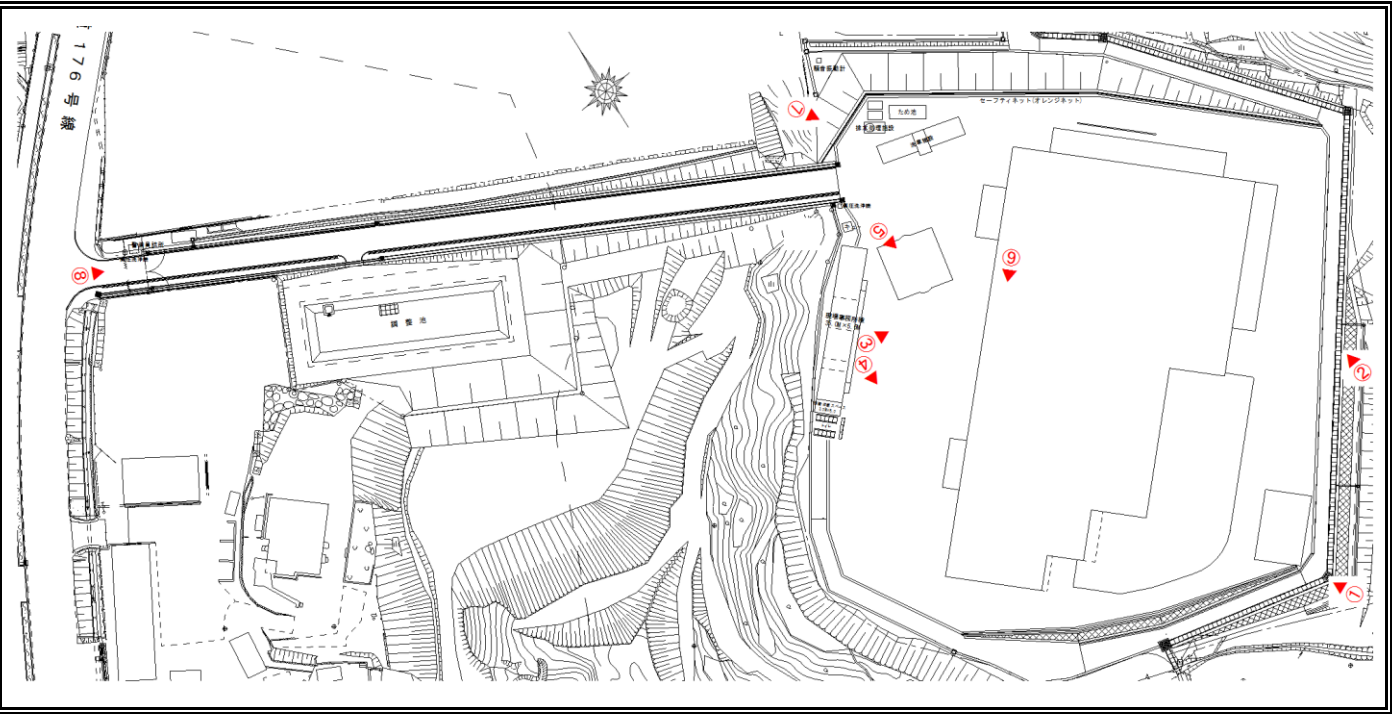

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ 計量棟 鉄骨建て方施工状況



写真⑥ 2階廊下 内装仕上げ施工状況



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h


工事進捗状況

令和元年11月度の現場の作業状況は以下の通りです。					
11/20～11/30	【エネ回収（炉室）】	各所溶接仕舞	11/20～11/26	【エネ回収（地下エリア）】	水中ポンプ据付
11/15～11/16	【エネ回収（ホッパエリア）】	点検歩廊据付			
11/1～11/30	【エネ回収（屋外）】	メタン発酵槽据付			
11/1～11/30	配管工事	エネ回収(B2FL～4FL)、プラットフォーム、リサ(1FL～3FL) サポート・配管敷設			
11/1～11/30	電気工事	エネ回収(1FL～4FL)、プラットフォーム ケーブルラック・電線管・ケーブル敷設			
11/1～11/30	築炉工事	アンカー取付、赤煉瓦、耐火・断熱煉瓦取付			
11/1～11/30	保温工事	炉室板金材取付	11/1～11/30	塗装工事	エネ・リサ(各所) 塗装
【11月末現在出来高（プラント）：68.1 % （全体）：79.1%】					

状況写真撮影位置

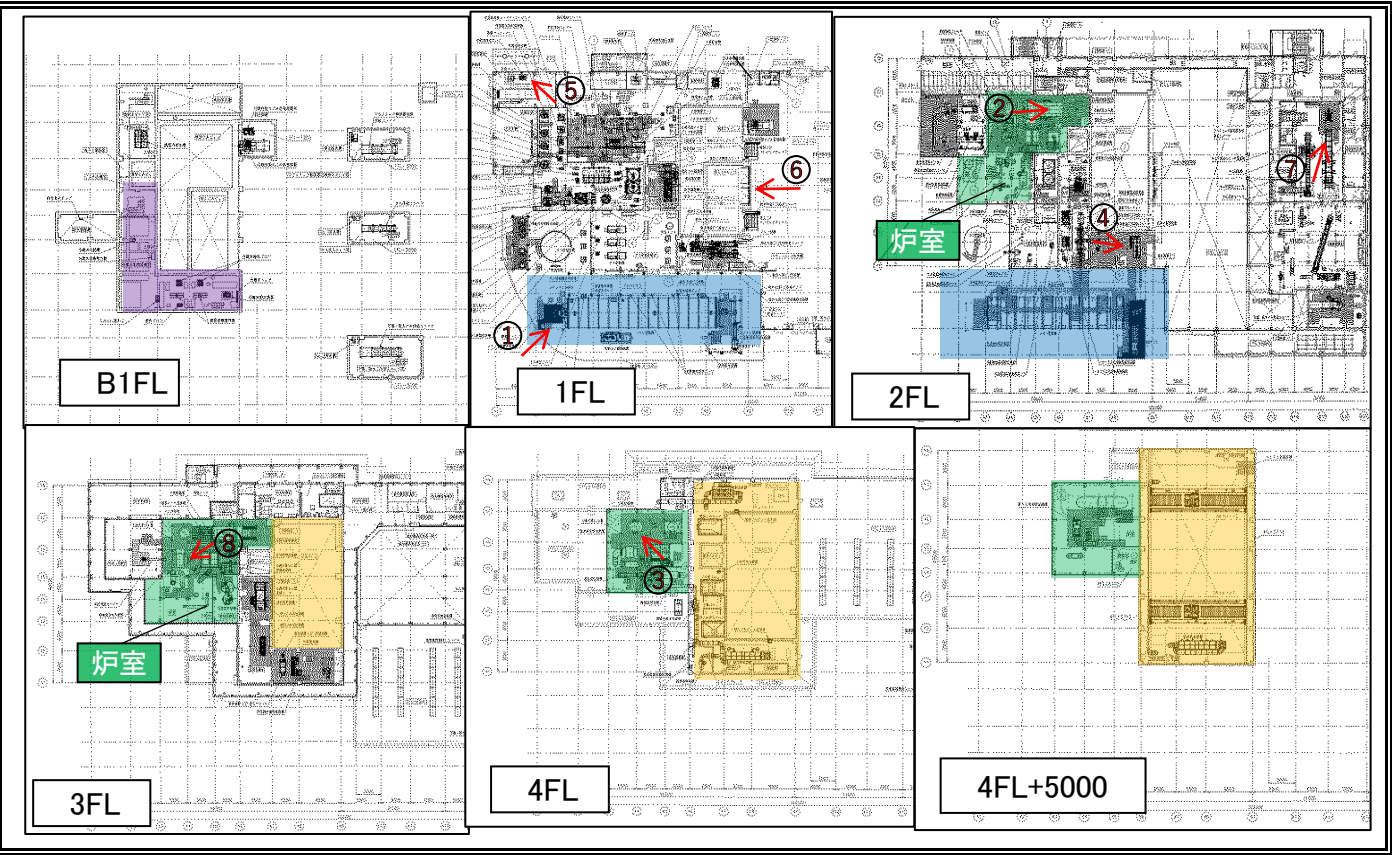

写真① メタン発酵槽

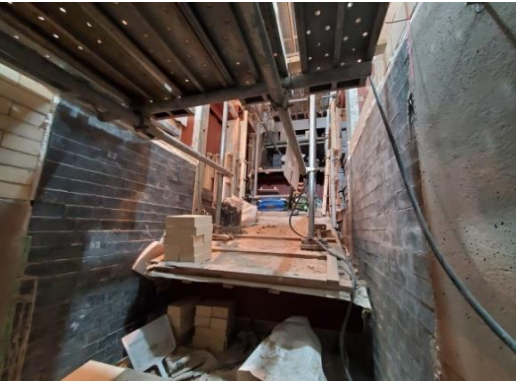

写真② 耐火物取付



写真③ 配管・サポート 敷設



写真④ 配管・サポート 敷設




写真⑤ 配管・電線管 敷設



写真⑥ 配管・電線管 敷設



写真⑦ リサイクルエリア 塗装

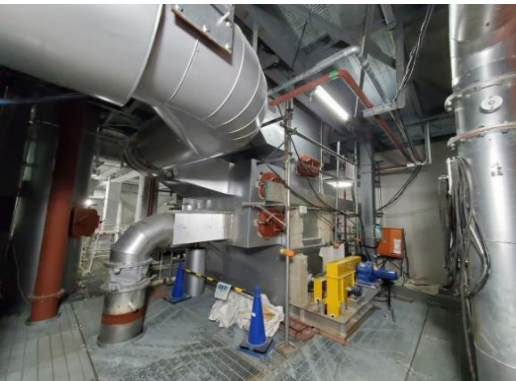

写真⑧ 板金取付
