


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

令和2年1月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
1/6～1/31	[各エリア 仮設工事]	内外足場解体・組替、ごみピット内部足場解体、付属棟足場解体。
1/6～1/31	[各エリア 内装工事]	内装壁・天井地下組～ボード貼～クロス貼。計量棟OA707施工～床仕上。
1/6～1/31	[各エリア 吹付工事]	各エリア・付属棟：外壁吹付・塗装。
1/6～1/31	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付、建具・扉吊込み。
1/6～1/31	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し化粧仕上げ・土間押さえ・各所補修。
1/6～1/31	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
1/6～1/31	[各エリア その他工事]	各所手摺取付、玄関庇鉄骨建方、各所シール。
1/6～1/31	[付属棟工事]	計量棟・洗車車庫棟：外壁・屋根仕上げ、内装仕上げ工事。
1/6～1/31	[外構工事]	雨水排水埋設配管・会所枡・側溝設置。AS舗装工事。
1/6～1/31	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管、各機器取付・調整。
【1月末現在出来高（建築）：94.0％ （全体）：90.6％】		

状況写真撮影方向（令和2年1月28日撮影）

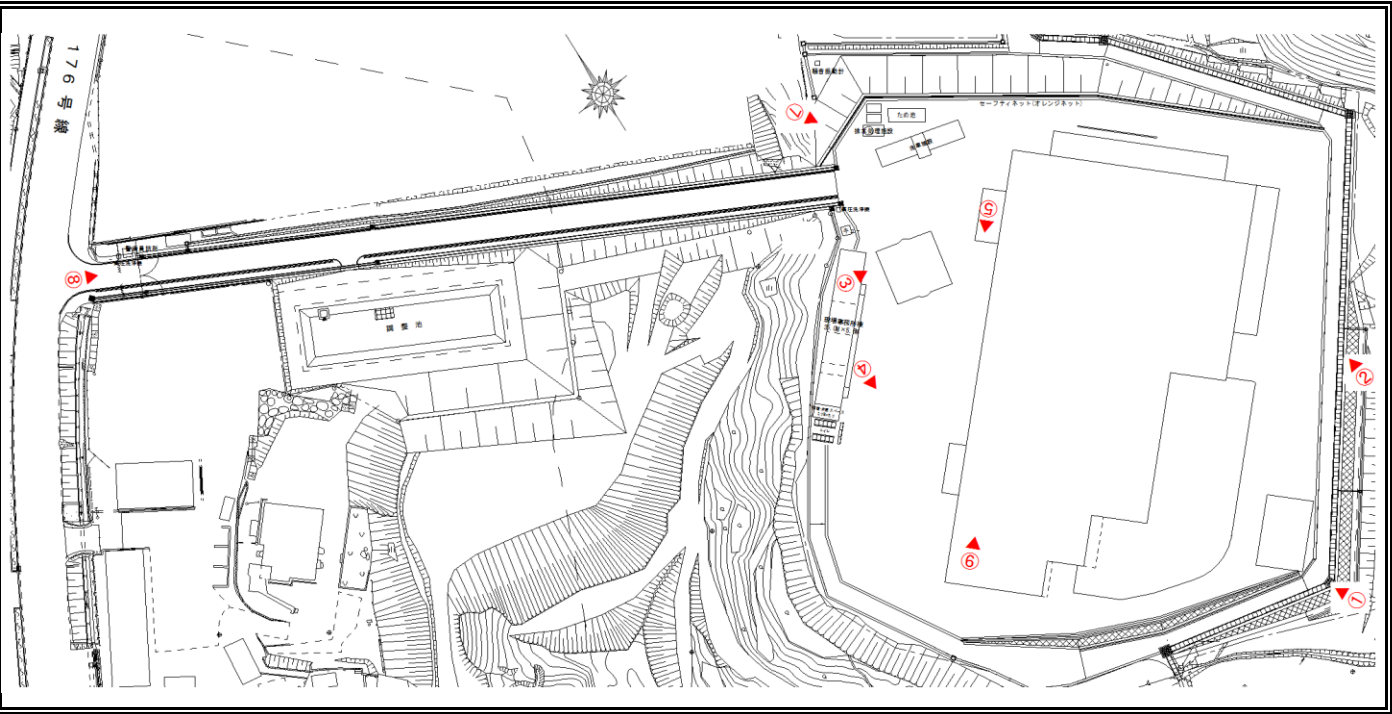

写真① 炉室・ごみピットエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ 計量棟・リサイクルエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ リサイクル棟 階段(A) 手摺・段板仕上げ



写真⑥ 3階見学者通路 内装仕上げ



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 （プラント担当者：岡井裕之）
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和2年1月度の現場の作業状況は以下の通りです。					
1/13～1/31	[エネ回収（炉室）]	各所仕舞・改造	1/6～1/23	[エネ回収（屋外）]	屋外仕舞工事、計量器据付
1/6～1/31	配管工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽　バルブ・配管敷設、各所気密試験			
1/6～1/31	電気工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽　ケーブルラック・電線管・ケーブル敷設			
1/6～1/25	築炉工事	再燃焼・ガス冷却室　吹付施工			
1/6～1/31	保温工事	メタン発酵槽 保温・板金取付、炉室各所板金仕舞			
1/6～1/31	塗装工事	エネ回収・炉室 各所塗装			
1/6～1/31	試運転	回転チェック・無負荷運転確認・各所通水・フラッシング			
		各計装機器I/Oチェック・ループチェック・シーケンスチェック・インターロックチェック			
【1月末現在出来高（プラント）： 87.1 % （全体）： 90.6%】					

状況写真撮影位置

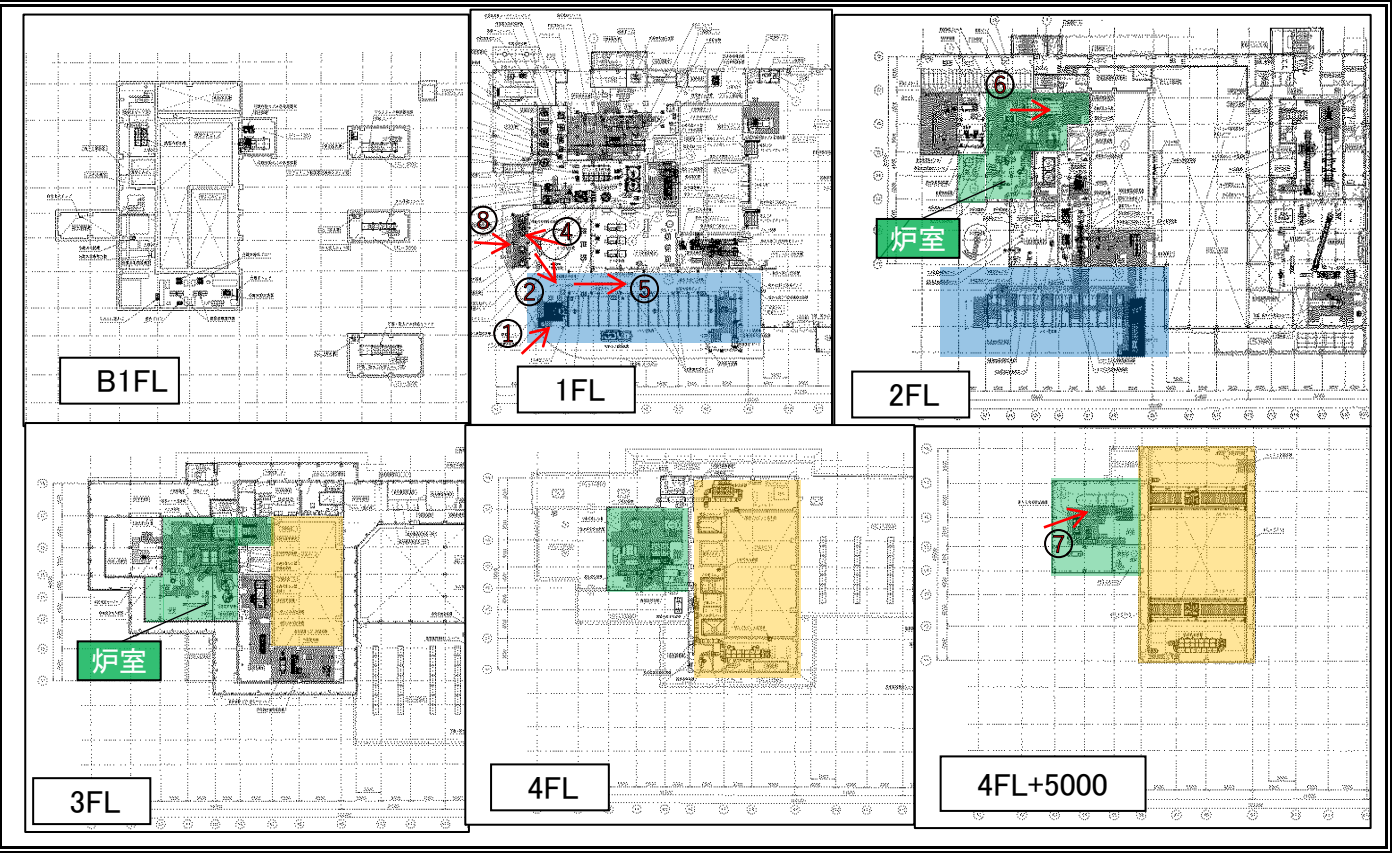

写真① メタン発酵槽 保温・板金取付



写真② メタン発酵槽 保温・板金取付




写真③ 計量器




写真④ 脱硫装置 配管・保温工事



写真⑤ 屋外 配管・ケーブル 敷設

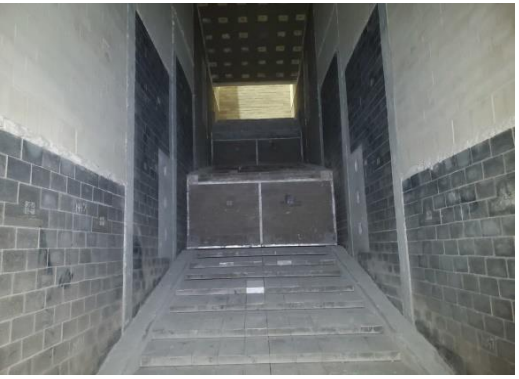

写真⑥ 耐火物 施工

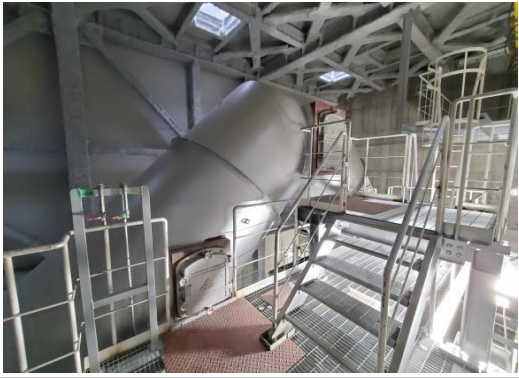

写真⑦ 炉室 塗装



写真⑧ 屋外架台 塗装
