



工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)	0772-45-1730
F A X		0772-45-1733		0772-45-1731

工事進捗状況

令和2年2月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
2/1～2/26	[各エリア 仮設工事]	内外足場解体・整備・搬出
2/1～2/29	[各エリア 内装工事]	内装壁・床・天井仕上げ、手直し・補修
2/1～2/29	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付、調整。
2/1～2/29	[各エリア 左官工事]	各所：左官仕上げ。手直し・補修。
2/1～2/29	[各エリア 塗装工事]	各所：塗装仕上げ、手直し・補修。
2/1～2/29	[各エリア 美装工事]	各所：美装仕上げ、ワックス。
2/1～2/29	[付属棟工事]	計量棟・洗車庫棟：外装・内装仕上げ。
2/1～2/29	[外構工事]	[前半エリア]：AS舗装・ライン引き・看板設置・ガードレール・交通標識設置。 [後半エリア]：タン発酵槽防液堤躯体、雨水排水、下層路盤工事。
2/1～2/29	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気・設備機器取付・試運転・調整。
【2月末現在出来高：96.0%】		

状況写真撮影方向（令和2年2月28日撮影）

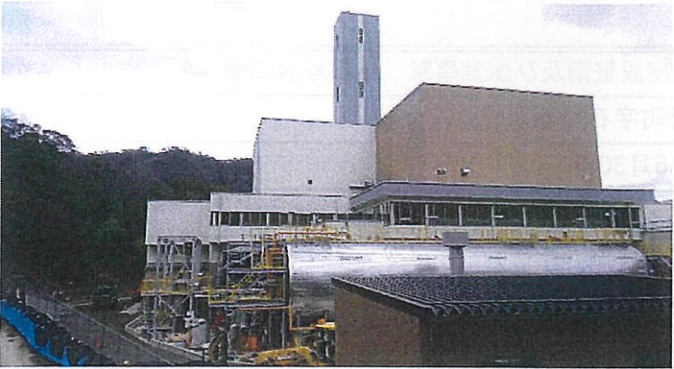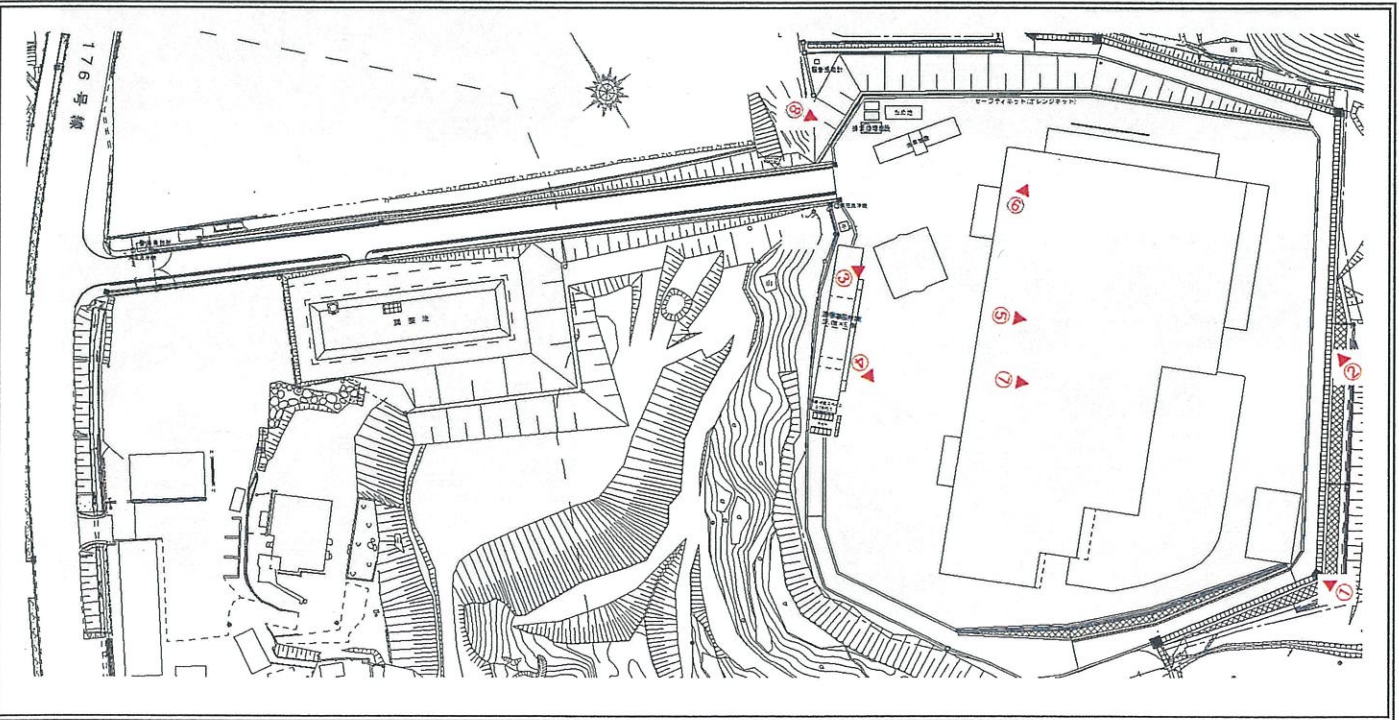

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ 計量棟・リサイクル～ごみピットエリア(北西から)




写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ プラットホーム 完成



写真⑥ エントランスホール 完成

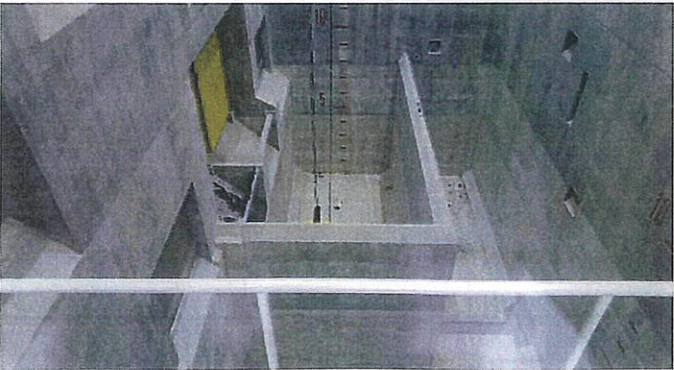

写真⑦ ごみピット 完成



写真⑧ 正面全景（進入路から）


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 (プラント担当者：岡井裕之)
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設 (ごみ焼却施設+メタンガス化施設)
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和2年2月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
2/1～2/29	[エネ回収（炉室）]	各所仕舞・改造、各所銘板・安全標識取付
2/1～2/29	配管工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽 配管・配管敷設、各所気密試験、貫通仕舞
2/1～2/29	電気工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽 ケーブルラック・電線管・ケーブル敷設、貫通仕舞
2/1～2/29	保温工事	メタン発酵槽・屋外配管 保温・板金取付、炉室各所板金仕舞
2/1～2/29	塗装工事	各所仕舞・改造、各所銘板・安全標識取付
2/1～2/29	試運転	回転チェック・無負荷運転確認・各所通水・フラッシング
		各計装機器I/Oチェック・ループチェック・シーケンスチェック・インターロックチェック
【2月末現在出来高：91.4%】		

状況写真撮影位置

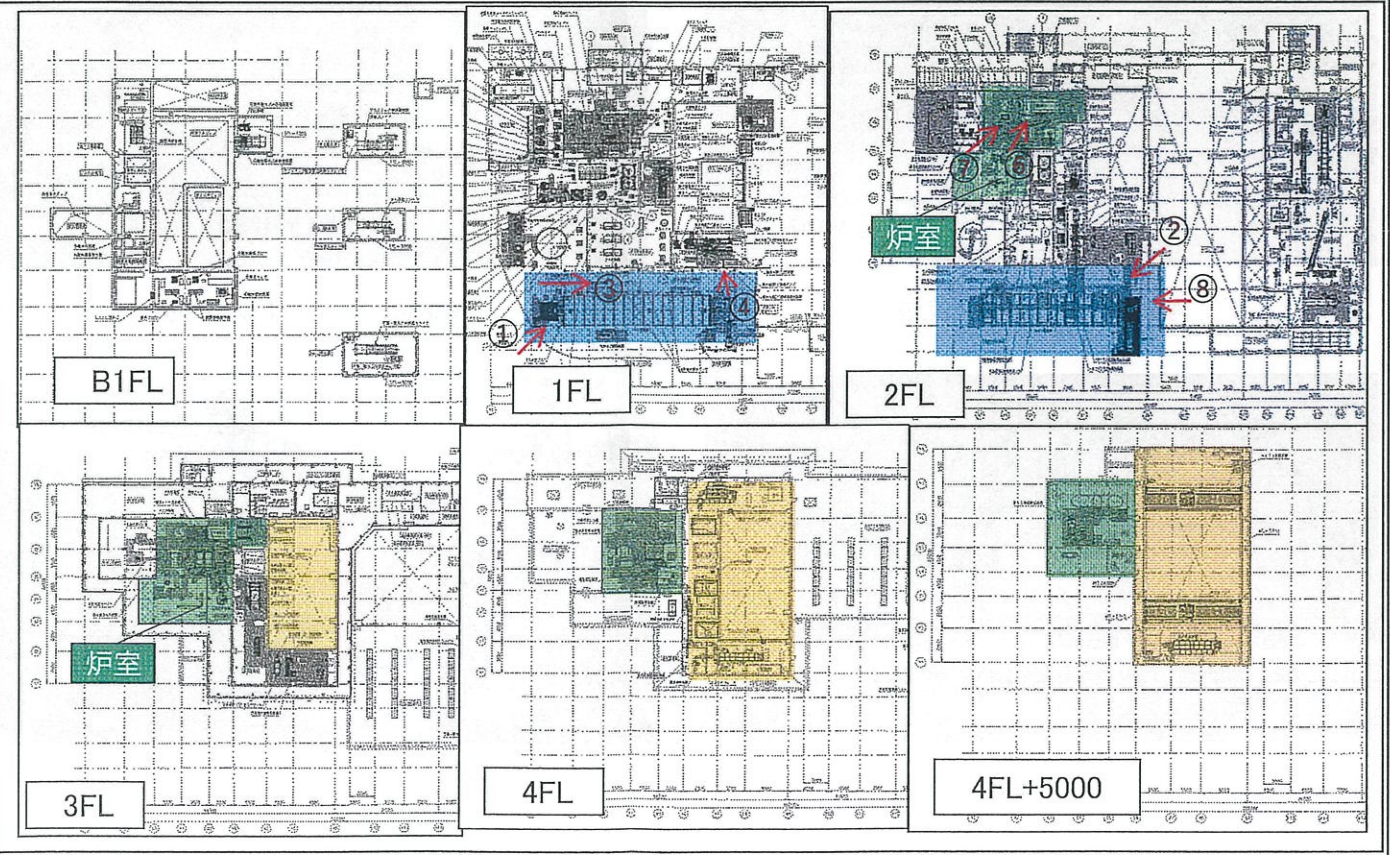


写真① メタン発酵槽 保温・板金取付



写真② メタン発酵槽・基質配管 保温・板金取付



写真③ 発酵槽周り 配管・保温・電気工事

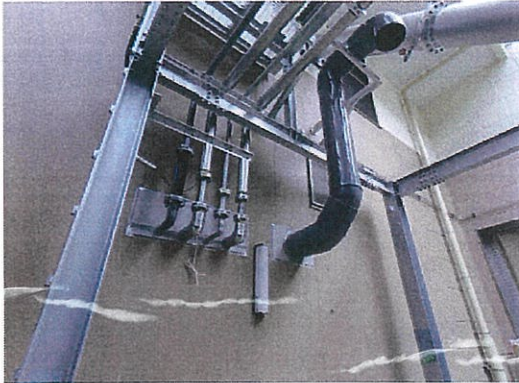

写真④ 配管貫通仕舞



写真⑤ 公害モニタリング装置



写真⑥ 銘板取付



写真⑦ 炉室 塗装



写真⑧ 屋外手摺 塗装
