

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事		
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内		
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日		
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体		
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者: 近藤 克信)		
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他		
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株) 0772-45-1730
F A X		0772-45-1733	0772-45-1731


工事進捗状況

令和2年3～6月度の現場の作業状況は以下の通りです。

3/1～3/31	[各エリア内外装工事]	サイン取付・手直し・補修・清掃・片付け
	[各エリア外構工事]	AS舗装・ライン・標識、サイン取付
	[電気・機械設備工事]	機器調整・試運転、測定作業・清掃・片付け
4/1～4/30	[各エリア外構工事]	ライン作業
	[各エリア植栽工事]	植栽作業
	[電気・機械設備工事]	機器調整・試運転、測定作業・清掃・片付け
5/1～5/31	[各エリア要望工事]	メタン発酵槽基礎仕上げ、洗車棟仕切り壁立上げ
	[電気・機械設備工事]	騒音対策
6/1～6/30	[引渡し準備]	場内除草作業、調整池浚渫・清掃

【6月末現在出来高：100.0%】


状況写真撮影方向（工事完了写真）

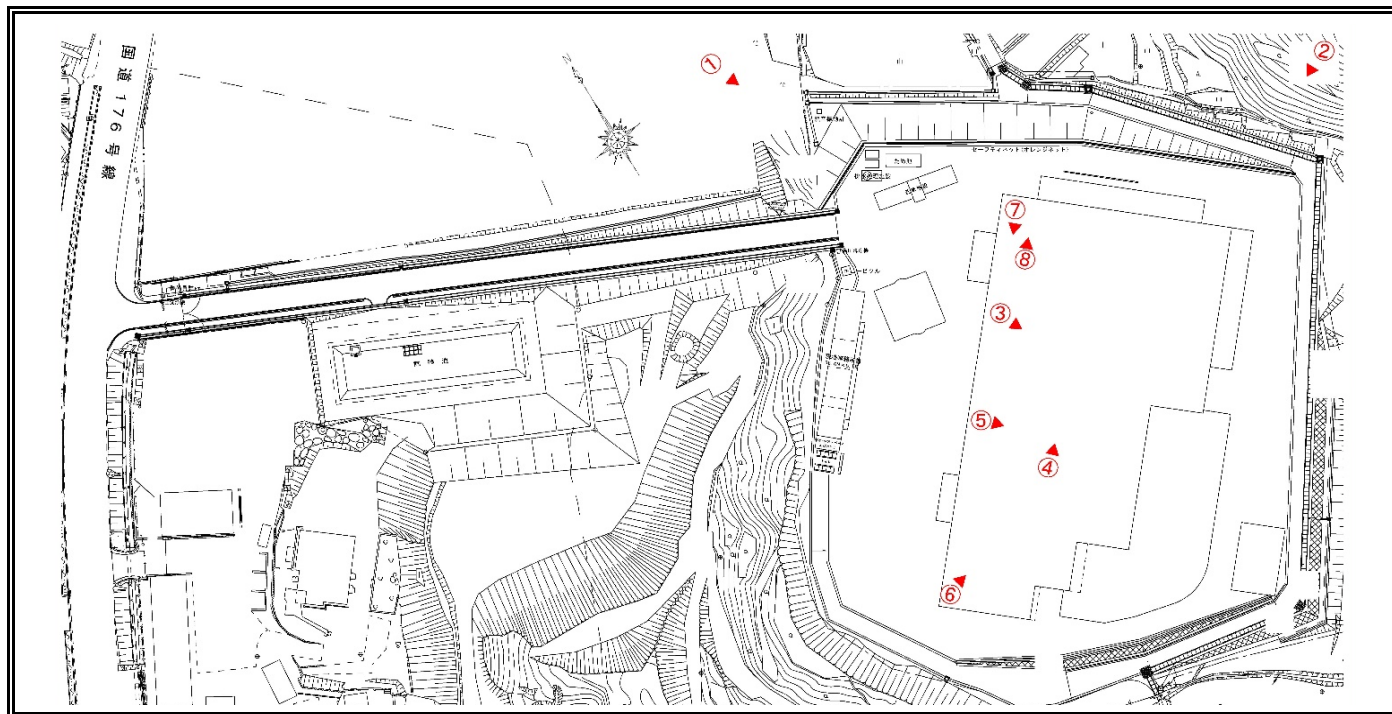


写真① 施設正面(航空写真)



写真② 施設背面(航空写真)

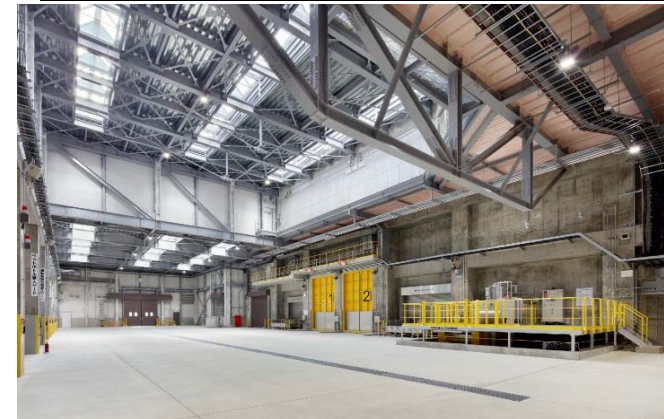

写真③ プラットホーム

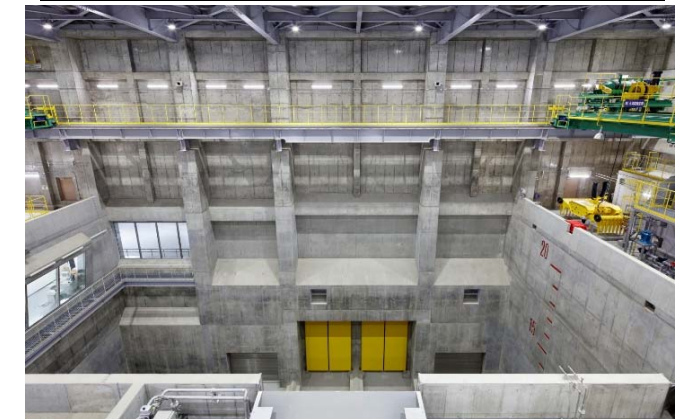

写真④ ごみピット



写真⑤ 中央制御室



写真⑥ 見学者通路



写真⑦ エントランスホール



写真⑧ 研修室



工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 (プラント担当者:岡井裕之)
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設 (ごみ焼却施設+メタンガス化施設)
	ごみ焼却施設: 30トン/24h メタンガス化施設: 20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設: 14.9トン/5h

工事進捗状況

2020年3~6月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
3/1~3/31	[エネ回収]	ろ布、リテーナ取付・各所仕舞工事
	[リサイクル]	コンベヤ回り止め溶接・各所文字書き
	試運転	焼却炉・リサイクル 負荷運転 乾燥焚き・各所通水・フラッシング
4/1~4/30	[エネ回収]	試運転対応
	試運転	メタン発酵槽軽負荷運転・リサイクル通常運転
5/1~5/31	[エネ回収(ガス発電機室)]	試運転対応
	試運転	焼却炉 負荷運転・休炉点検
6/1~6/30	[エネ回収] [リサイクル]	試運転対応
	試運転	各機器負荷運転
【6月度末現在出来高:】 100.0%		

状況写真撮影位置

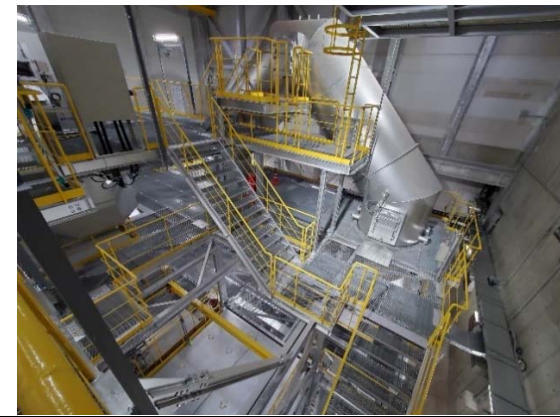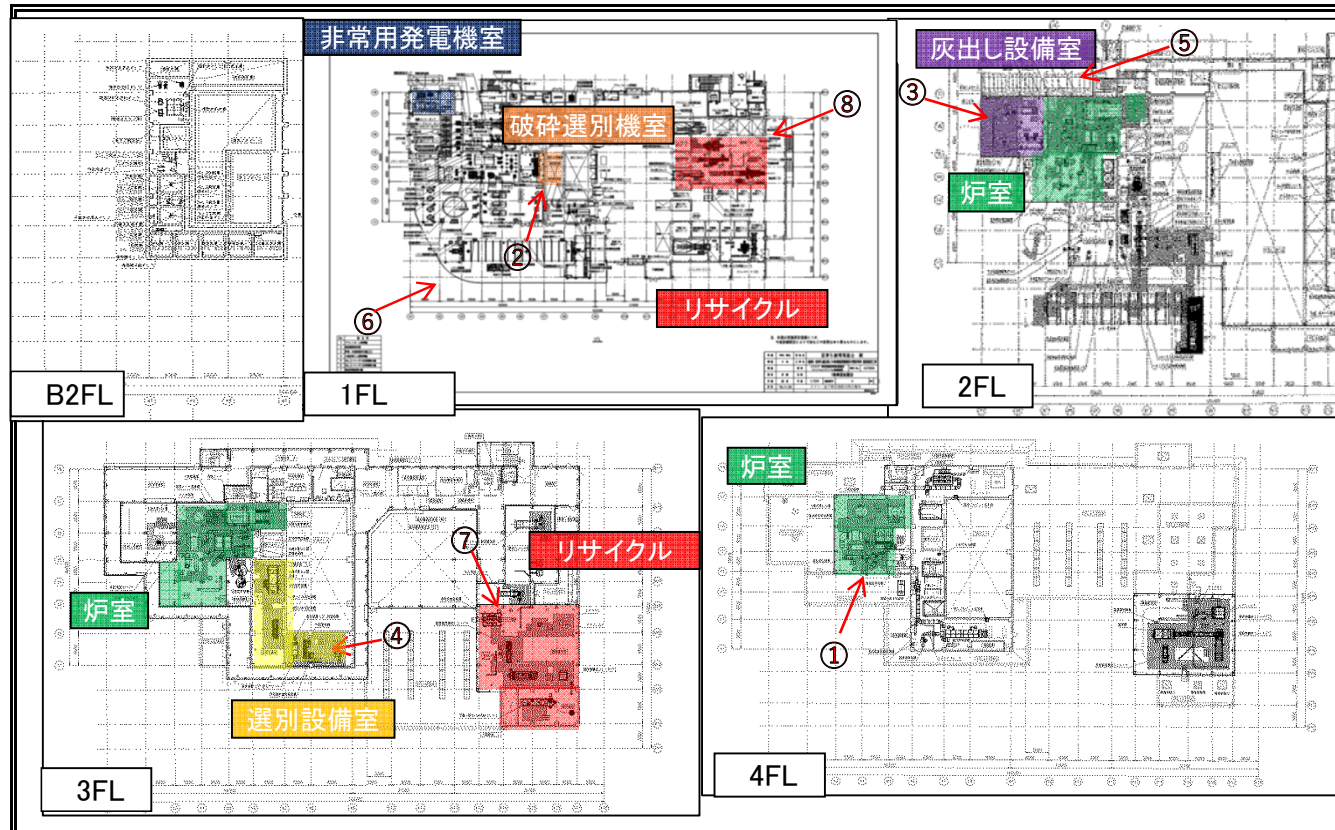

①炉室



②破碎選別機室



③灰出し設備室



④選別設備室




⑤電気室



⑥メタン発酵槽



⑦機械選別室

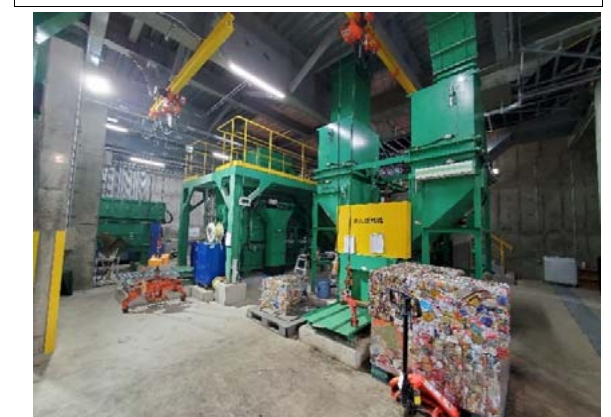

⑧搬出場 (1)
