


工 事 名	ごみ処理施設敷地造成工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工 期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請 負 者	河嶋建設株式会社
現 場 代 理 人	杉本 誠
現 場 事 務 所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月
計画	10.2%	16.2%
実施	10.0%	

[撮影位置明示]

造成計画図

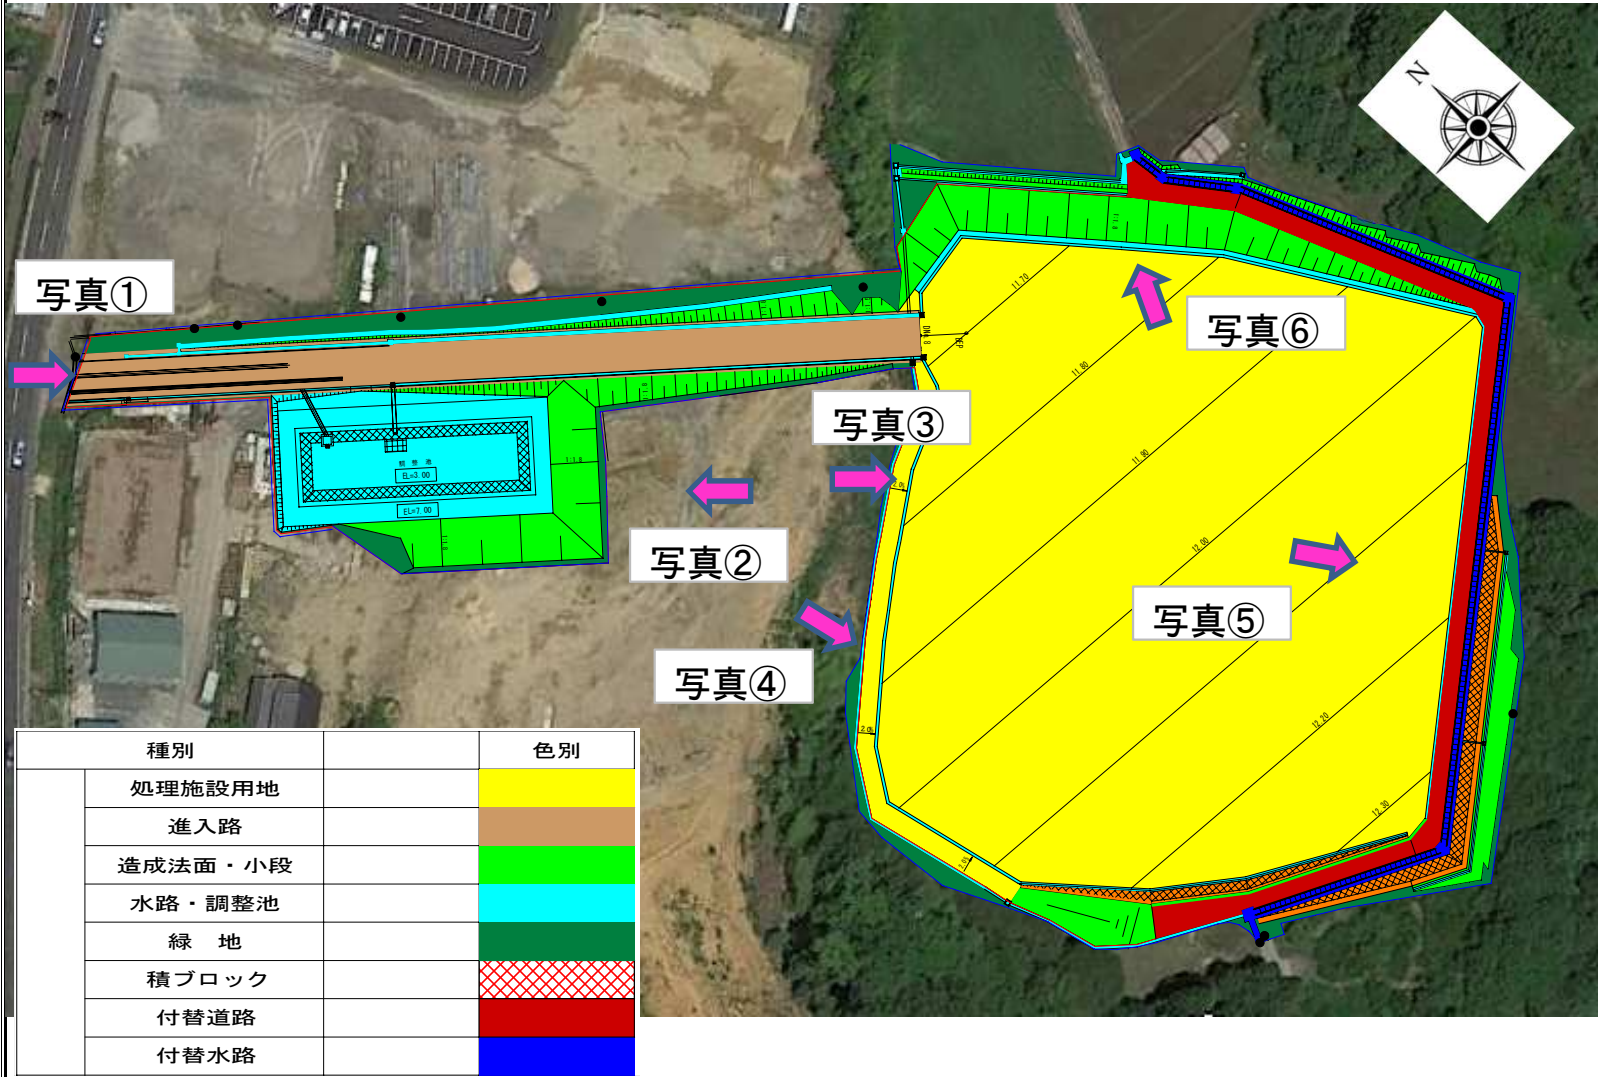

写真① 進入路国道入口



写真② 進入路地山掘削



写真③ 造成部全景



写真④ 造成部全景



写真⑤ 造成部切土



写真⑥ 造成部仮沈砂池



平成28年3月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】


工 事 名	ごみ処理施設敷地造成工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工 期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請 負 者	河嶋建設株式会社
現 場 代 理 人	杉本 誠
現 場 事 務 所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月
計画	10.2%	16.2%	24.1%
実施	10.0%	17.0%	

[撮影位置明示]

造成計画図

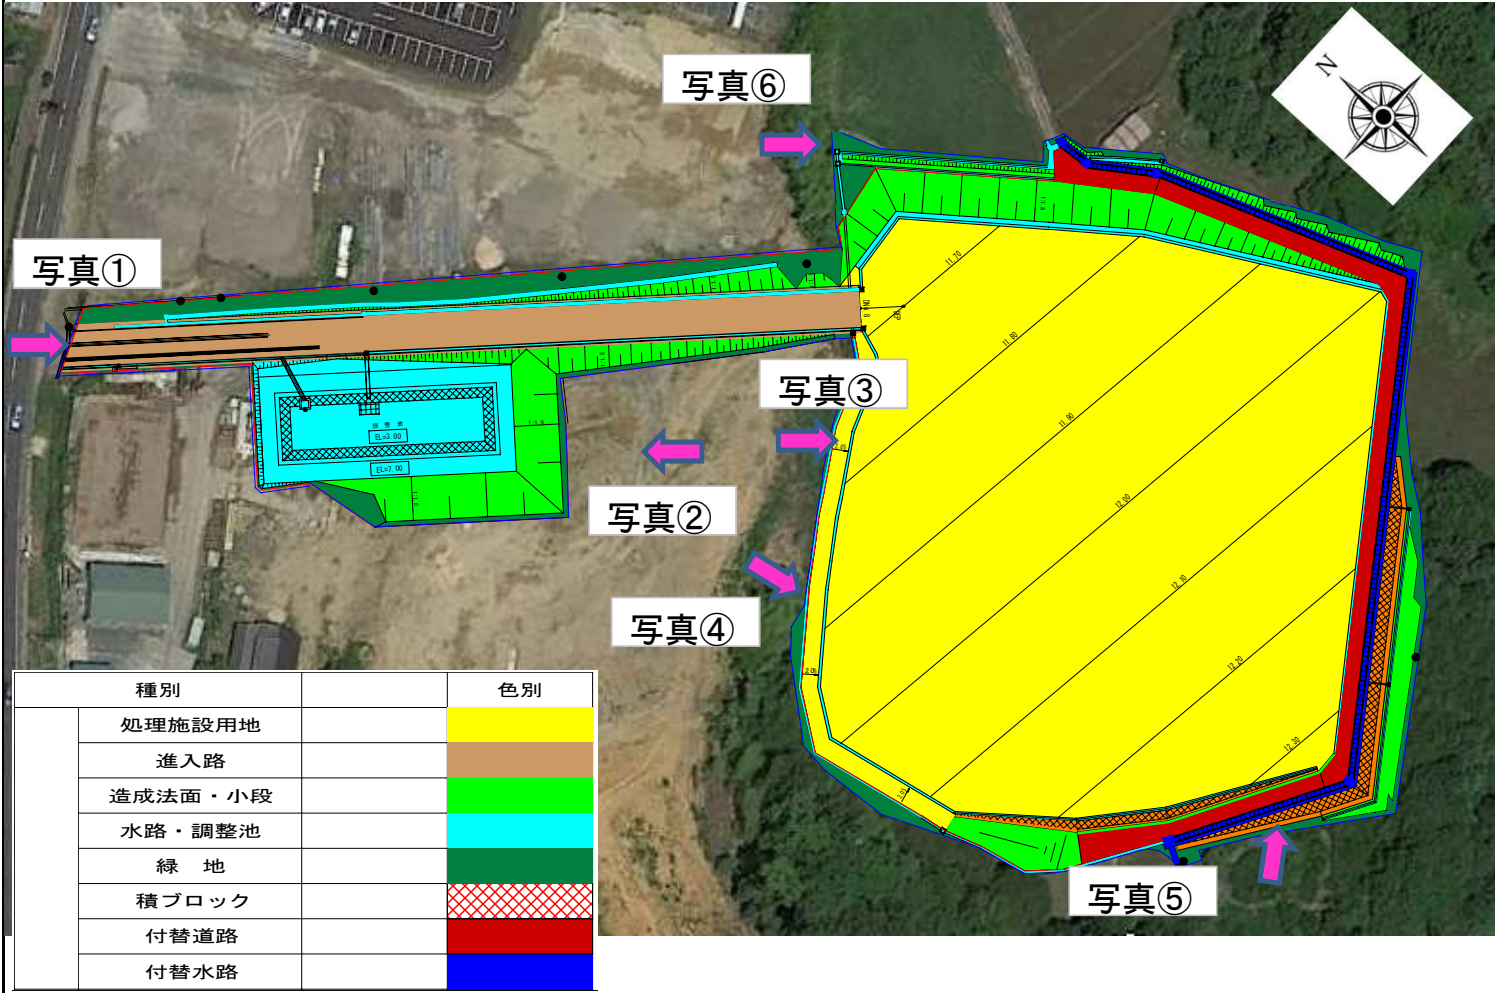

写真① 進入路国道入口



写真② 進入路地山掘削



写真③ 造成部全景



写真④ 造成部全景



写真⑤ 造成部切土



写真⑥ 造成部排水路



平成28年4月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】

河嶋建設株式会社


工 事 名	ごみ処理施設敷地造成工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工 期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請 負 者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	

[撮影位置明示]

造成計画図

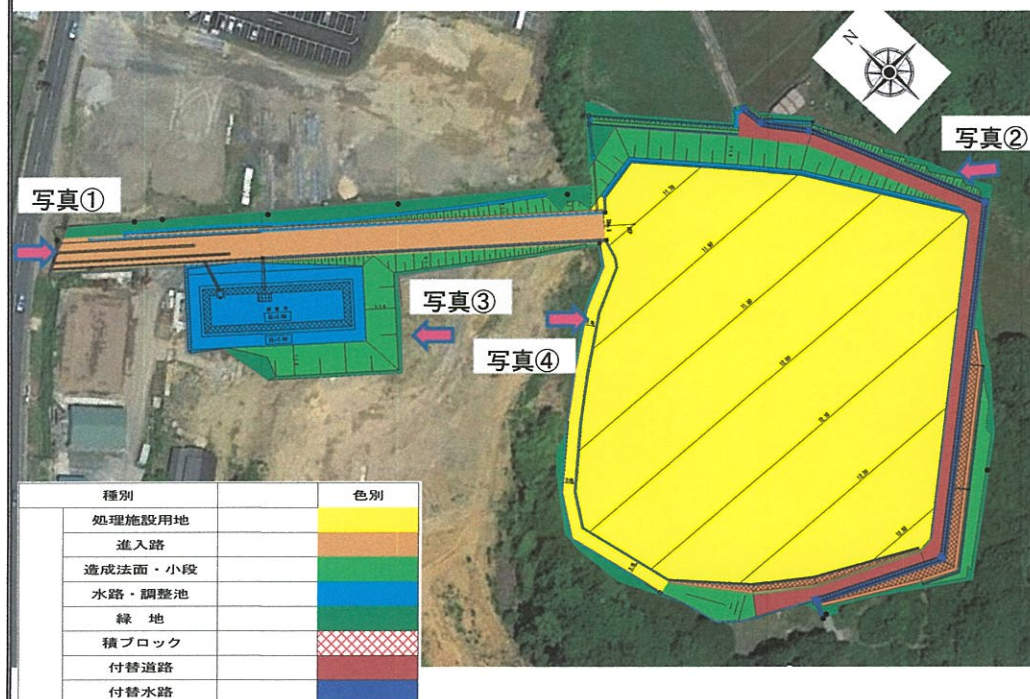

写真① 進入路国道入口



写真② 造成部排水路



写真③ 調整池全景



写真④ 造成部全景



平成28年5月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】

河嶋建設株式会社


工 事 名	ごみ処理施設敷地造成工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工 期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請 負 者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	

[撮影位置明示]

造成計画図

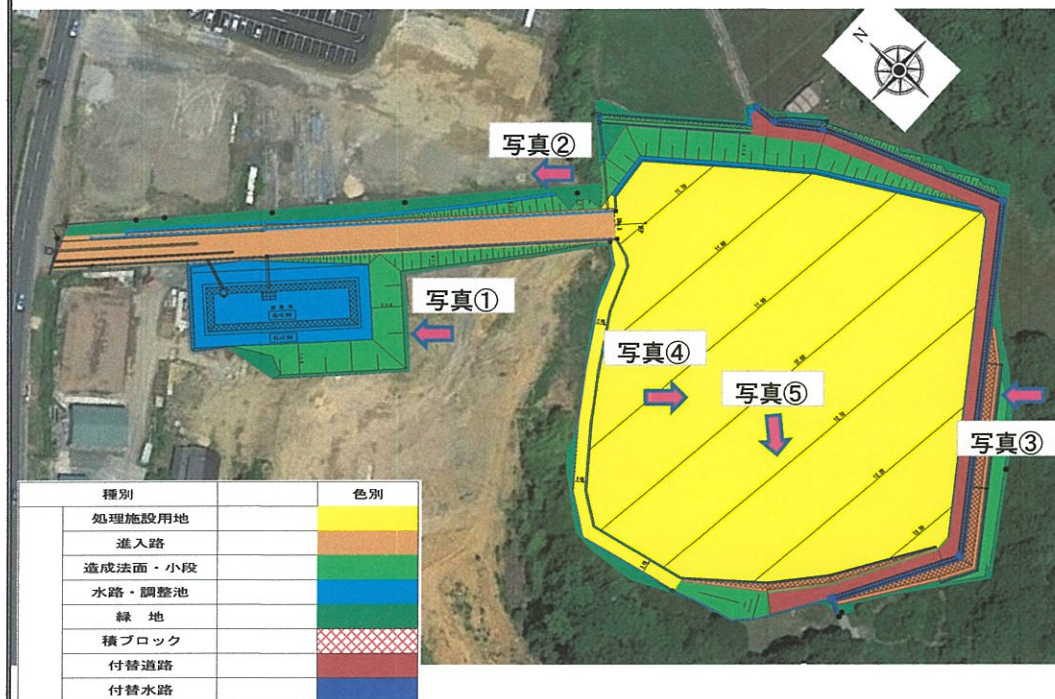

写真① 進入路調整池



写真② 進入路排水路



写真③ 造成地全景



写真④ 造成部東側



写真⑤ 造成部南側



平成28年6月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】

河嶋建設株式会社


工 事 名	ごみ処理施設敷地造成工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工 期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請 負 者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	60.0%
	8月				
計画	75.1%				
実施					

[撮影位置明示]

造成計画図

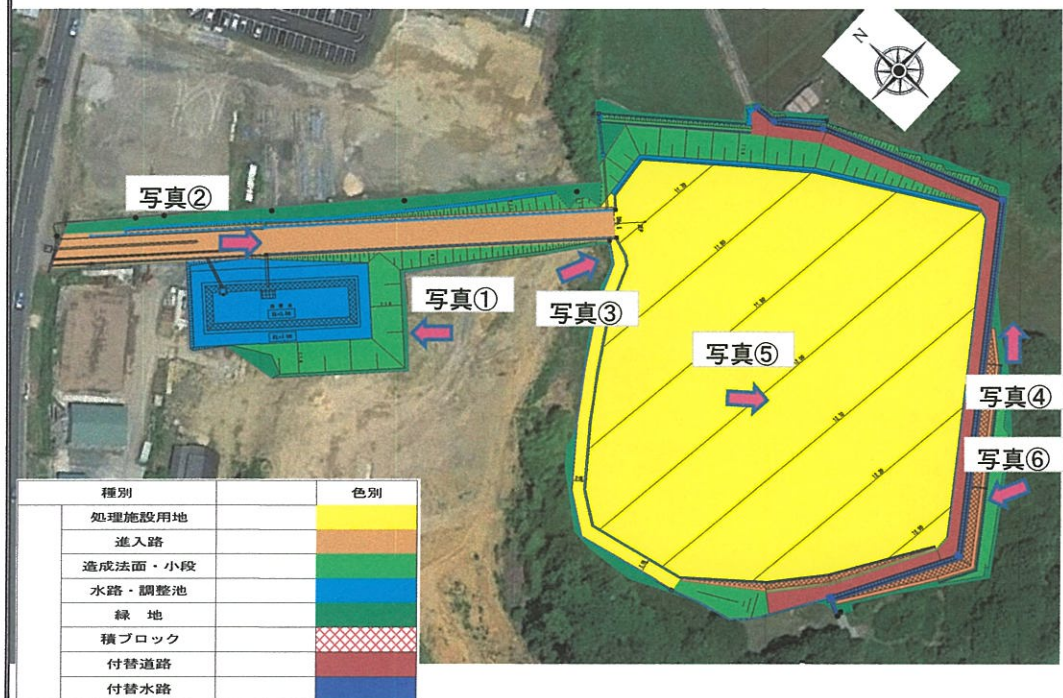

写真① 進入路調整池



写真② 進入路入口



写真③ 造成部南側



写真④ 造成部北側



写真⑤ 造成部東側



写真⑥ 造成部南側



平成28年7月末撮影
