

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】


工事名	ごみ処理施設敷地造成工事
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請負者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	60.0%
	8月	9月			
計画	75.1%	81.0%			
実施	73.2%				

[撮影位置明示]

造成計画図

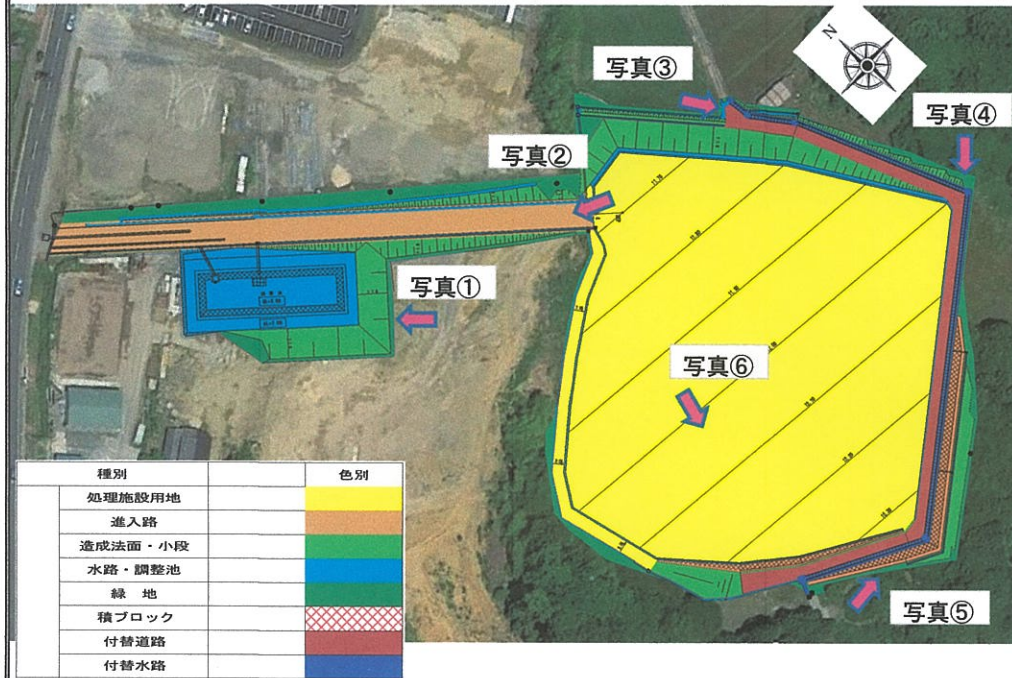

写真① 進入路調整池



写真② 進入路終点側



写真③ 造成部北側



写真④ 造成部東側



写真⑤ 造成部東側



写真⑥ 造成部南側



平成28年8月末撮影


ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】

工事名	ごみ処理施設敷地造成工事
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請負者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】					
	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	60.0%
	8月	9月	10月		
計画	75.1%	81.0%	95.2%		
実施	73.2%	82.9%			

[撮影位置明示]

造成計画図

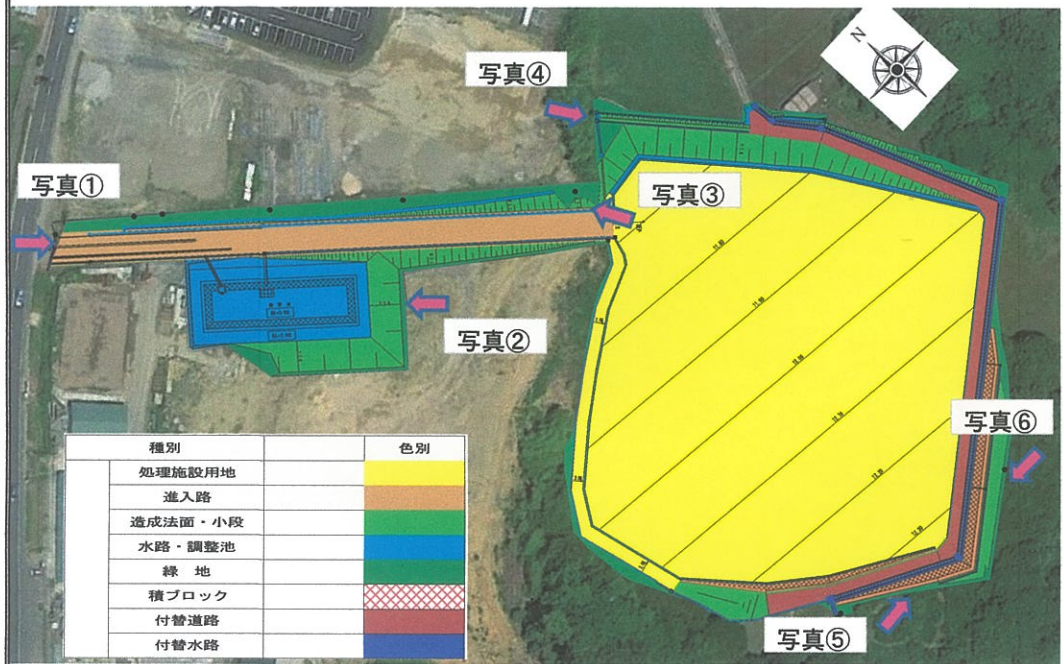

平成28年9月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】


工事名	ごみ処理施設敷地造成工事
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請負者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	60.0%
	8月	9月	10月	11月	
計画	75.1%	81.0%	95.2%	100%	
実施	73.2%	82.9%	93.2%		

[撮影位置明示]

造成計画図

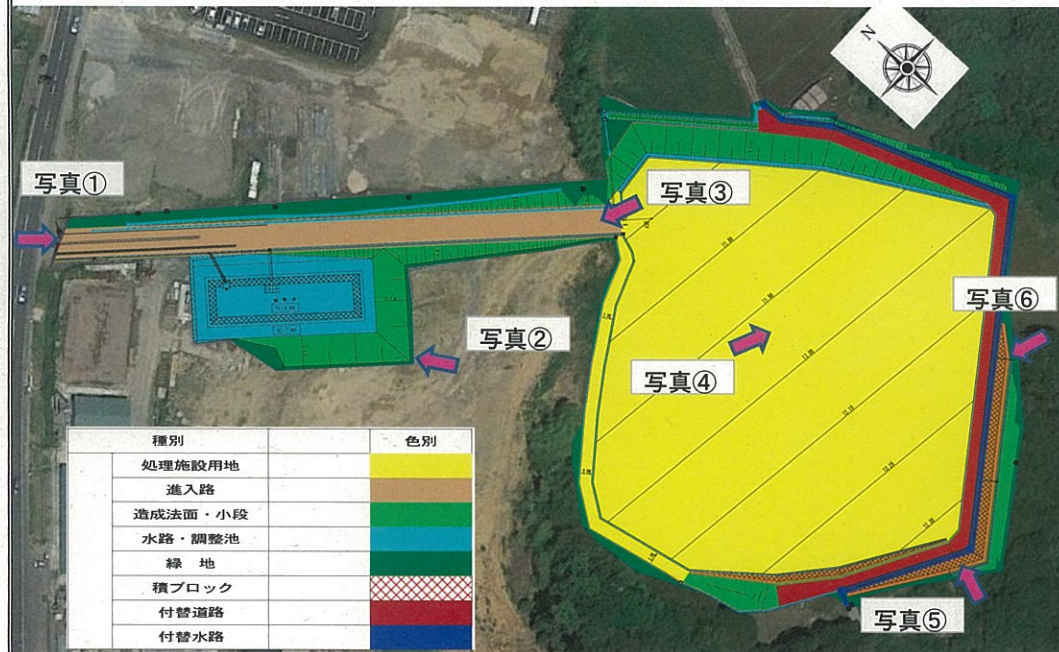

平成28年10月末撮影

ごみ処理施設敷地造成工事【工事進捗状況】


工事名	ごみ処理施設敷地造成工事
工事場所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川 地内
工期	平成27年12月3日～平成28年11月30日
請負者	河嶋建設株式会社
現場代理人	杉本 誠
現場事務所	京都府宮津市字須津1608 河嶋建設株式会社
TEL	0772-46-4122
FAX	0772-46-5540

【工事進捗率】

	3月	4月	5月	6月	7月
計画	10.2%	16.2%	24.1%	34.6%	53.2%
実施	10.0%	17.0%	26.9%	34.0%	60.0%
	8月	9月	10月	11月	
計画	75.1%	81.0%	95.2%	100%	
実施	73.2%	82.9%	93.2%	100%	

[撮影位置明示]

造成計画図

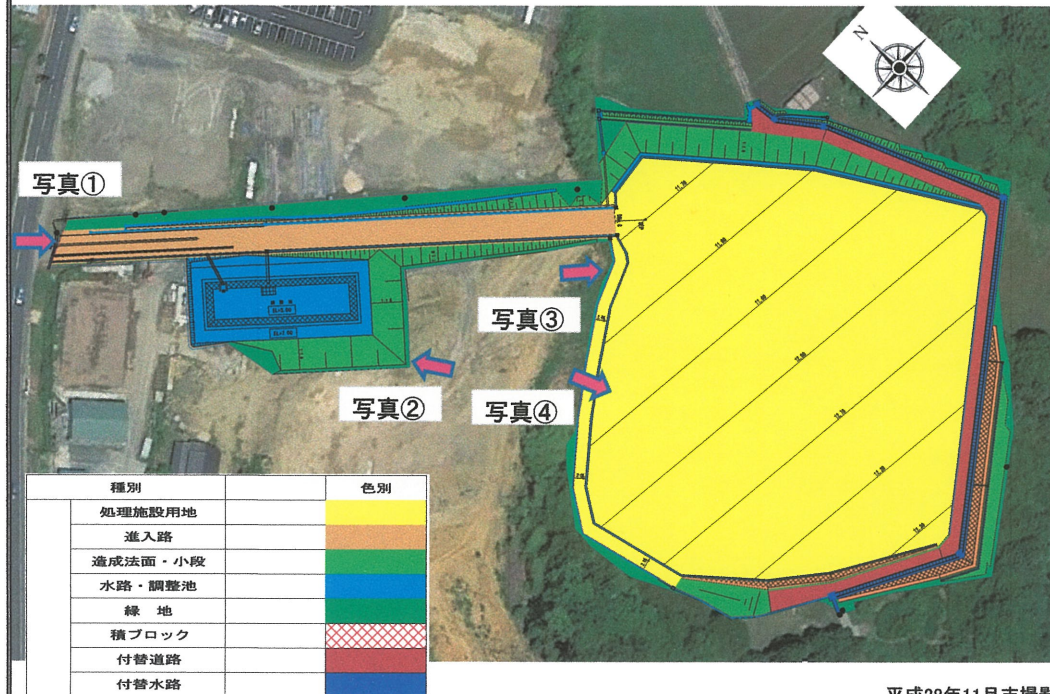

平成28年11月末撮影

着工前

完了

