

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H29年10月度」工事進捗状況報告書


工事概要

工 事 名	(仮称) 宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事				
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内				
工 期	平成28年 4月22日～平成31年 7月31日				
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体				
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)				
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他				
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730	
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731	

工事進捗状況

平成29年10月度の現場の作業状況は以下の通りです。				
「本体工事」				
10/ 1～10/31	〔柱状改良杭(工法)〕	柱状改良杭(工法)施工		
		299本施工済 / 443本	10/末残本数：	144 本
10/ 6～10/31	〔杭残土搬出・処分〕	杭残土(適時)搬出・場外処分		
			10/末処分量：	2684 m3
10/ 1～10/14	〔ごみピット土留め〕	土留め(H鋼・シートパイル)施工		
10/ 1～	〔鉄骨工事〕	鉄骨製作		

状況写真撮影方向(H29年10月31日撮影)

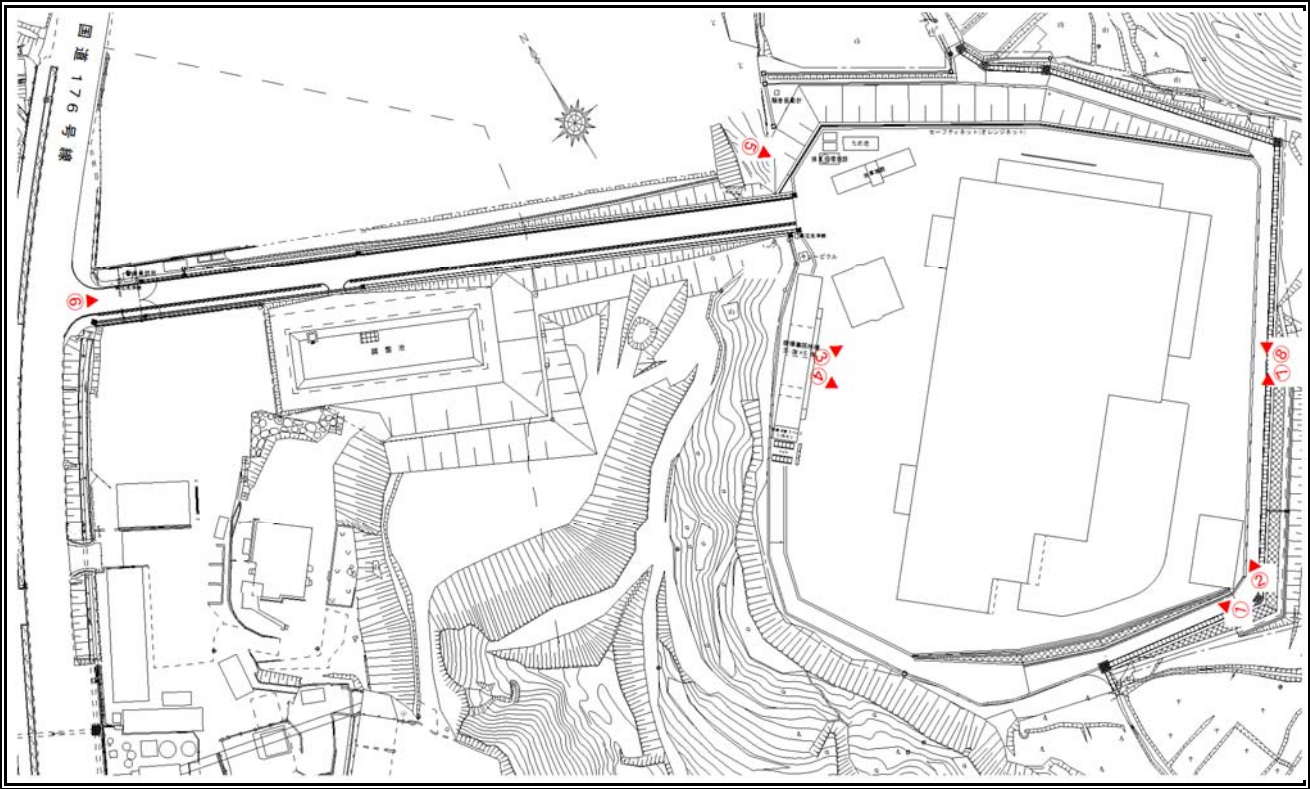

写真① 敷地西側全景(南角から)



写真② 敷地東側全景(南角から)



写真③ 敷地東側全景(事務所から)



写真④ 敷地西側全景(事務所から)



写真⑤ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ 柱状改良杭工事 本杭打設状況



写真⑧ 柱状改良杭工事 杭残土搬出路整備状況
