

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年4月度」工事進捗状況報告書

工事概要


工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事		
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内		
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日		
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体		
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)		
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他		
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)
F A X		0772-45-1733	
			0772-45-1730
			0772-45-1731

工事進捗状況

平成30年4月度の現場の作業状況は以下の通りです。

4/2～4/12	[ごみピット 躯体工事]	B2階 地中梁・耐圧版・段差止め型枠解体作業
4/4～4/14	[ごみピット 防水工事]	B2階 打継・セパ穴・外周防水作業
4/16～4/25	[ごみピット 土工事]	B2階 地中梁外周埋戻し作業
4/26～4/30	[ごみピット 土留工事]	2・3段目 切梁・腹起し撤去作業
4/2～4/10	[リサイクルエリア 土工事]	基礎埋戻し・砕石転圧・土間シート・断熱材敷込作業
4/5～4/19	[リサイクルエリア 土間工事]	配筋・型枠・コンクリート打設
4/25～4/28	[リサイクルエリア 躯体工事]	破碎機基礎配筋・型枠・アンカーセット作業
4/11～4/13	[炉室エリア 土工事]	基礎埋戻し・砕石転圧・土間シート敷込作業
4/14～4/26	[炉室エリア 土間工事]	配筋・型枠・コンクリート打設
		4月末現在出来高 : 11.0%

状況写真撮影方向(H30年4月28日撮影)

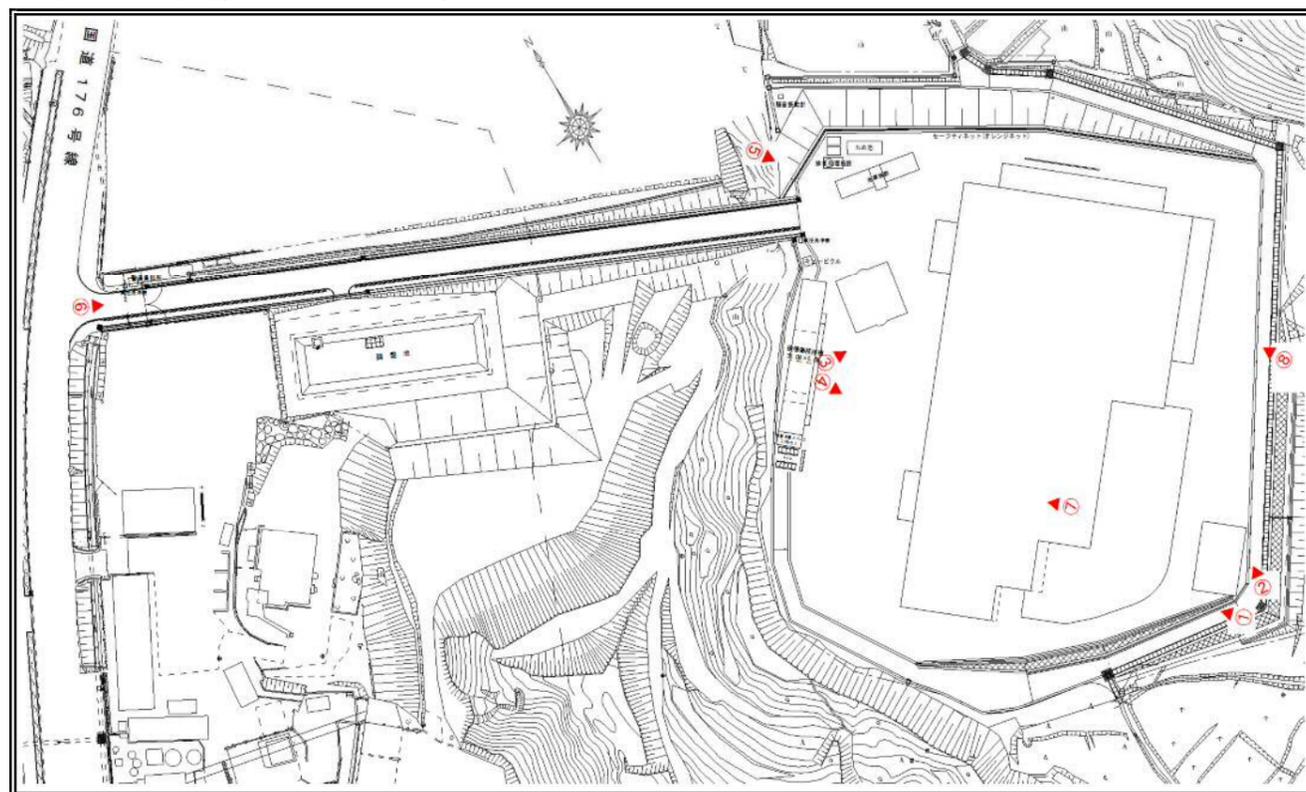

写真① 敷地西側全景(南角から)



写真② 敷地東側全景(南角から)



写真③ 敷地東側全景(事務所から)



写真④ 敷地西側全景(事務所から)



写真⑤ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ ごみピット B2階地中梁外周埋戻し完了  
切梁腹起し(2・3段目)解体作業



写真⑧ リサイクル棟 土間スラブコンクリート打設完了  
破碎機基礎型枠組立作業
