


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 （土木建築 責任者：近藤 克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年9月度の現場の作業状況は以下の通りです。			
9/12～9/23	[リサイクルエリア 鉄骨]	デッキ張り・スタッド溶接各所仕舞。	
9/1～9/30	[リサイクルエリア 鉄筋・型枠]	1階柱・壁・2階梁・スラブ 配筋。1階柱・壁・張り型枠組立。	
9/12	[プラットフォームエリア 土間]	土間スラブ Con打設。	
9/3・5	[ごみピットエリア 躯体]	B1階躯体Con打設。	
9/7～9/20	[ごみピットエリア 土・防水]	躯体型枠解体～外周防水～埋戻し。	
9/19～9/22	[ごみピットエリア 土留工事]	土留めシートパイル撤去作業。	
9/21～9/26	[炉室エリア 基礎 土工事]	基礎掘削工事。	
9/6～9/13	[メタン発酵槽エリア 土工事]	基礎下地盤改良②工事。	【9月末現在出来高：18.0%】

状況写真撮影方向（H30年9月25日撮影）

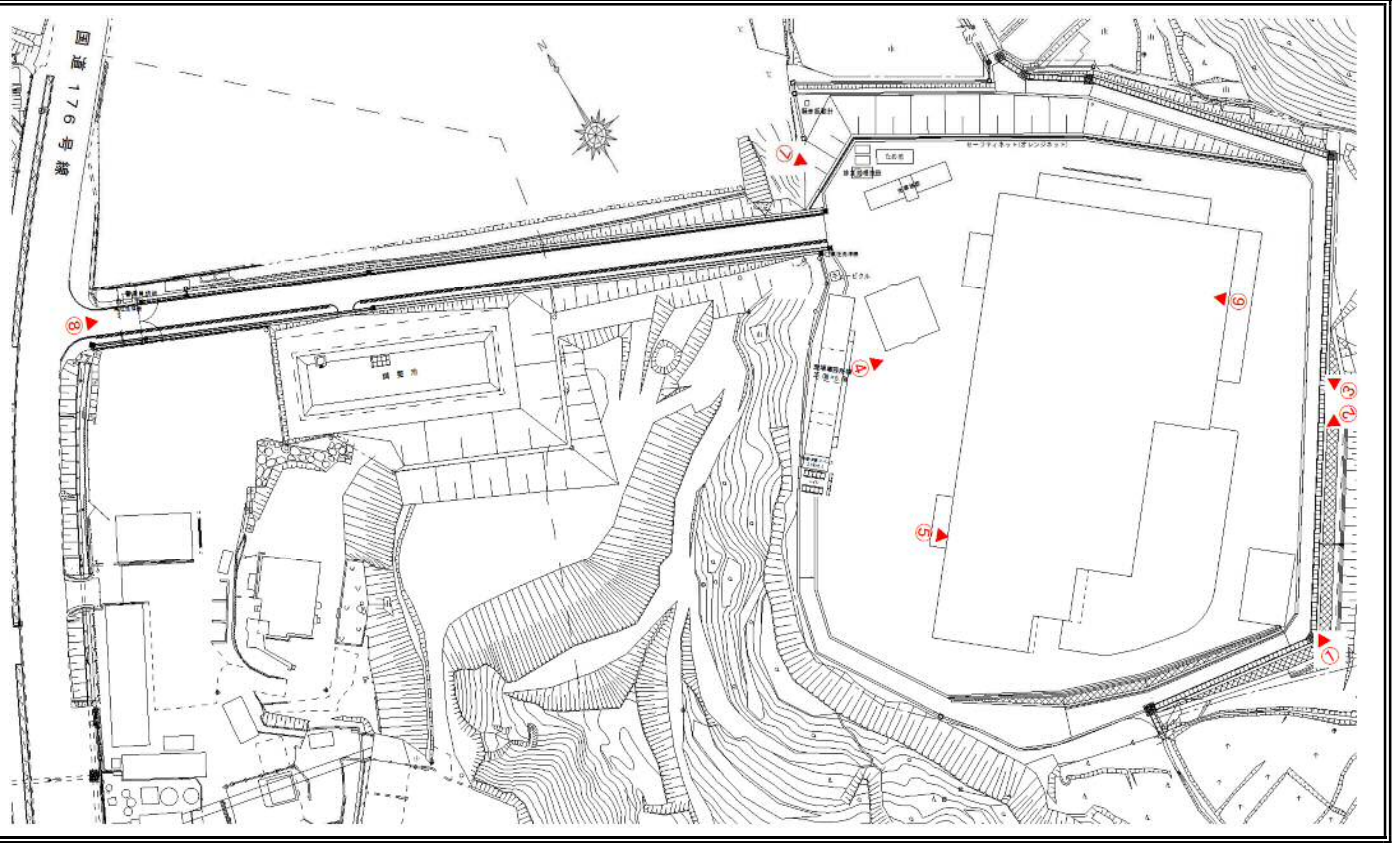

写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真④ プラットホーム・リサイクルエリア(事務所から)



写真⑤ 炉室棟 基礎掘削作業



写真⑥ リサイクル棟 2階 スラブ 配筋作業



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計
