


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 （土木建築 責任者：近藤 克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年4月度の現場の作業状況は以下の通りです。				
4/2～4/12	[ごみピット 躯体工事]	B2階	地中梁・耐圧版・段差止め型枠解体作業	
4/4～4/14	[ごみピット 防水工事]	B2階	打継・セパ穴・外周防水作業	
4/16～4/25	[ごみピット 土工事]	B2階	地中梁外周埋戻し作業	
4/26～4/30	[ごみピット 土留工事]	2・3段目	切梁・腹起し撤去作業	
4/2～4/10	[リサイクルエリア 土工事]		基礎埋戻し・砕石転圧・土間シート・断熱材敷込作業	
4/5～4/19	[リサイクルエリア 土間工事]		配筋・型枠・コンクリート打設	
4/25～4/28	[リサイクルエリア 躯体工事]		破碎機基礎配筋・型枠・アンカーセット作業	
4/11～4/13	[炉室エリア 土工事]		基礎埋戻し・砕石転圧・土間シート 敷込作業	
4/14～4/26	[炉室エリア 土間工事]		配筋・型枠・コンクリート打設	4月末現在出来高 ： 11.0%

状況写真撮影方向(H30年4月28日撮影)

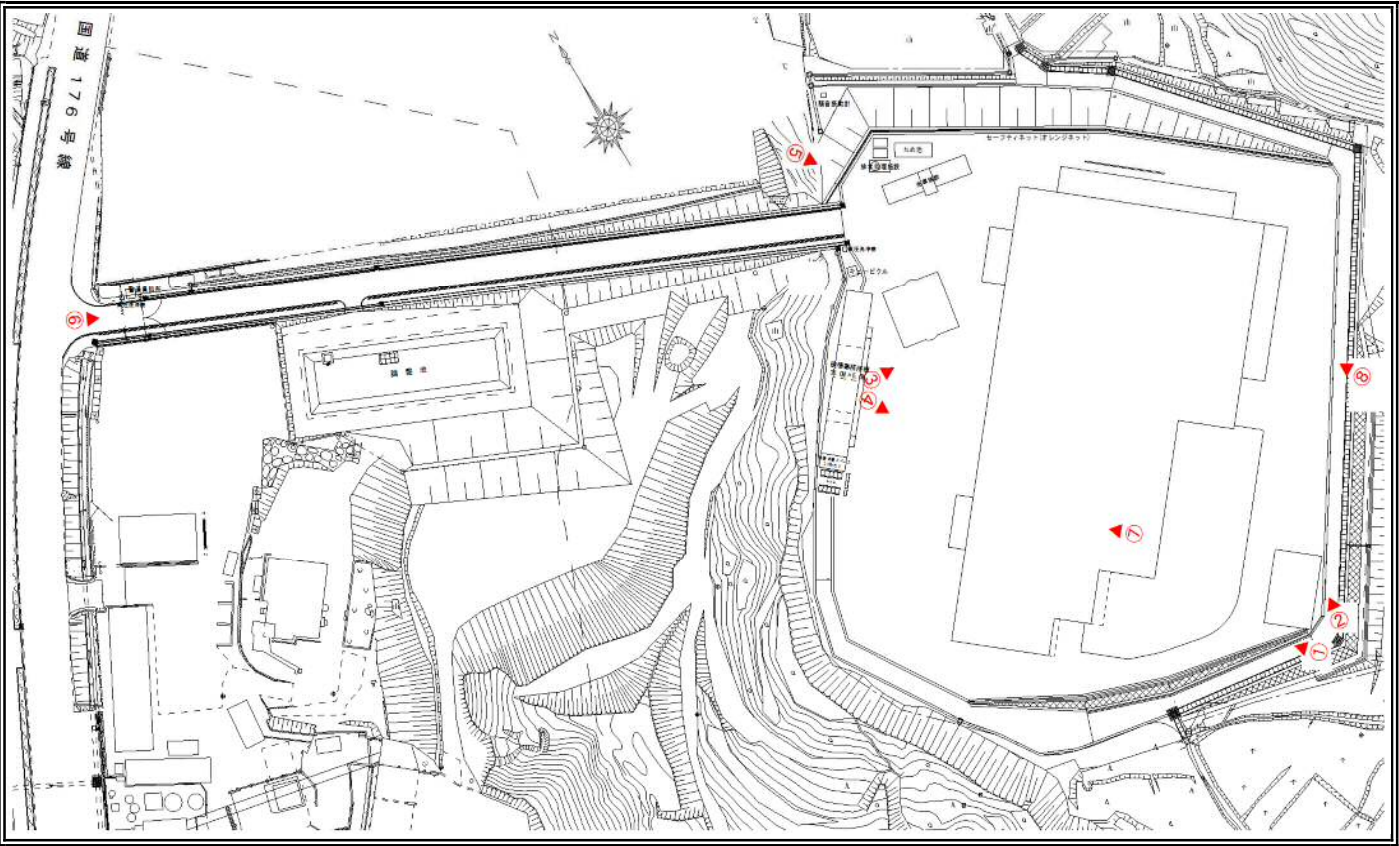

写真① 敷地西側全景(南角から)



写真② 敷地東側全景(南角から)



写真③ 敷地東側全景(事務所から)



写真④ 敷地西側全景(事務所から)



写真⑤ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ ごみピット B2階地中梁外周埋戻し完了
切梁腹起し(2・3段目)解体作業



写真⑧ リサイクル棟 土間スラブコンクリート打設完了
破碎機基礎型枠組立作業


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 （土木建築 責任者：近藤 克信）			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年5月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
5/1～5/2	[ごみピット土・土留工事]	切梁・腹起し(2・3段目)撤去、外周埋戻し
5/7～5/31	[ごみピット仮設工事]	B2階 外周足場、鉄筋足場、支保工足場組み作業
5/9～5/31	[ごみピット躯体工事]	B2階 柱・梁・壁配筋、CB溶接作業
5/25～5/31	[ごみピット躯体工事]	B2階 柱・梁・壁型枠組立作業
5/1～5/15	[各エリア機械基礎]	機械基礎型枠～コンクリート打設～脱型
5/1～5/19	[外構工事 北側]	北側重力式擁壁 掘削～鉄筋・型枠～コンクリート打設～脱型
5/21～5/31	[外構工事 北側]	擁壁埋戻し・電気設備・械設備 埋設配管・パドール、路床
5/28～5/29	[助燃貯留槽]	貯留槽掘削・砕石・捨コン打設
5月末現在出来高 ： 11.7%		

状況写真撮影方向(H30年6月1日撮影)

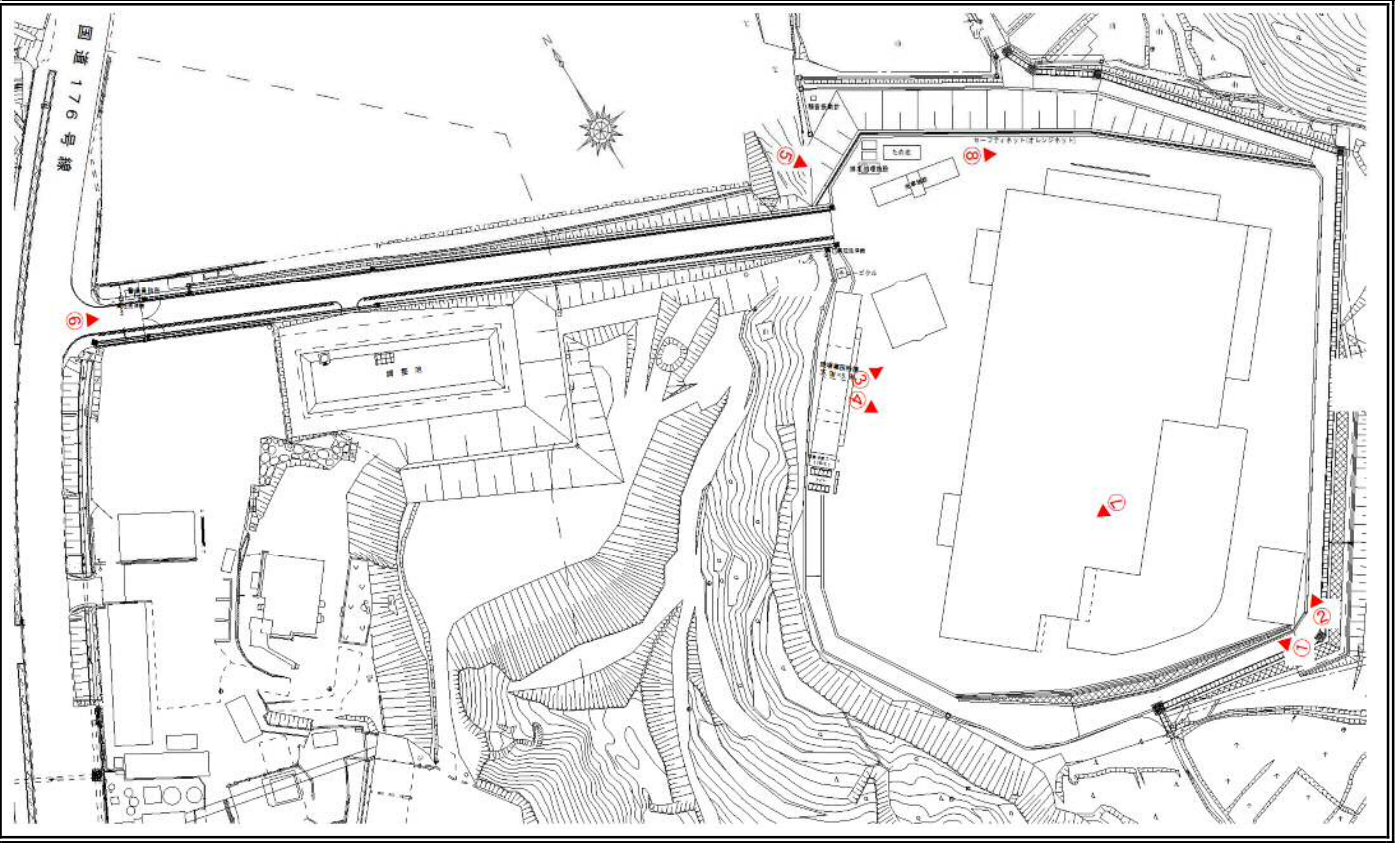

写真① 敷地西側全景(南角から)



写真② 敷地東側全景(南角から)



写真③ 敷地東側全景(事務所から)



写真④ 敷地西側全景(事務所から)



写真⑤ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑥ 進入路ゲート・騒音振動計



写真⑦ ごみピット B2階 柱・梁・壁配筋完了
〃 型枠建て込み作業



写真⑧ 外構北側 重力式擁壁コンクリート打設・脱型
車路路床整正・鉄板敷き作業

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年6月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事				
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内				
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日				
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体				
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)				
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他				
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730	
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731	


工事進捗状況

平成30年6月度の現場の作業状況は以下の通りです。

6/1～6/22	〔ごみピット 躯体工事〕	B2階躯体、B1階スラブ 配筋・型枠組立、コンクリート打設 (6/19・21・22)
6/25～6/30	〔ごみピット 躯体工事〕	B2階躯体 型枠脱型作業
6/26～6/30	〔ごみピット 防水工事〕	B2階躯体 外周 セパ埋め、シール、塗膜防水
6/1～6/30	〔屋外工事〕	ガス貯留槽基礎下改良、助燃貯留槽埋戻、電気・設備埋設配管 他
6/26～6/27	〔プラント工事(鉄回収)〕	助燃油貯留槽据付
6/20～6/30	〔プラント工事(リサイクル)〕	各機器墨出し、アンカー打設、プラスチック製容器包装供給コンベヤ かん供給コンベヤ、不燃・粗大ごみ受入ホパ・供給コンベヤ据付

6月末現在出来高 : 13.0%

状況写真撮影方向 (H30年6月30日撮影)

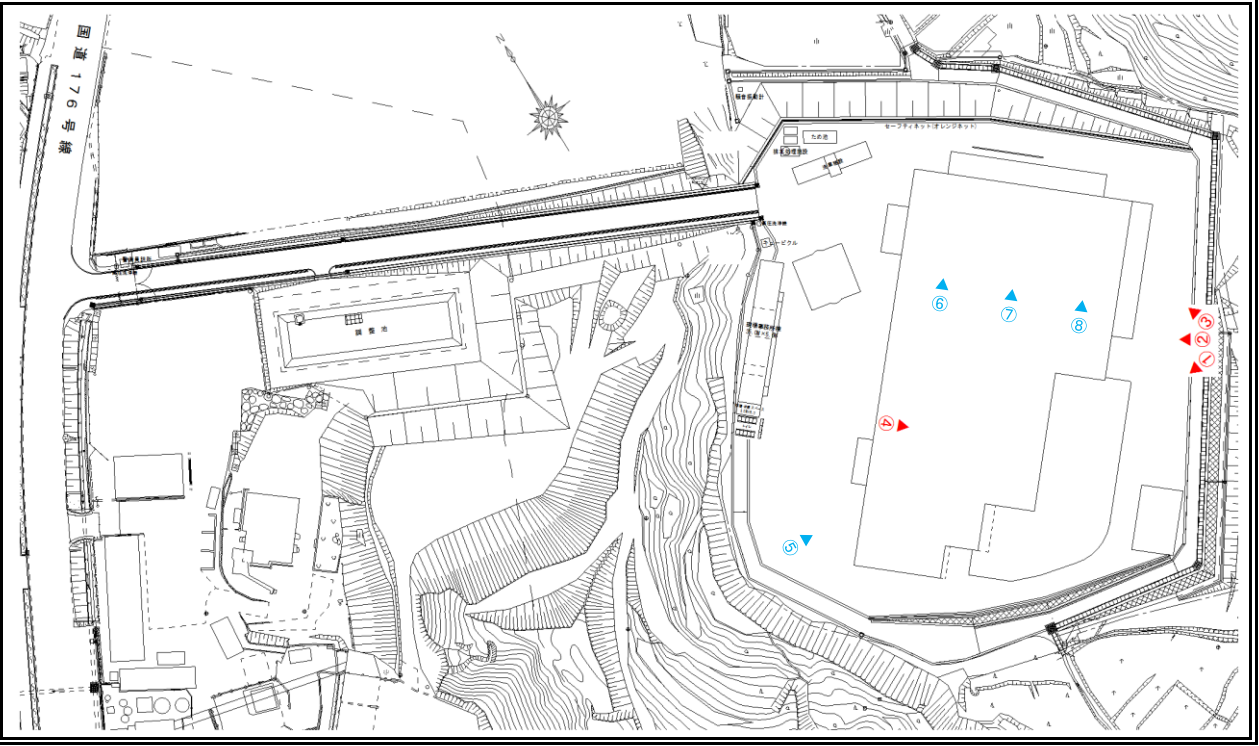

写真① 敷地南側全景(南東方向から)



写真② 敷地中央全景(南東方向から)



写真③ 敷地北側全景(南東方向から)



写真④ ごみピットB2階躯体・B1階スラブ CON打設完了



写真⑤ 助燃油貯留槽 据付完了



写真⑥ プラスチック製容器包装供給コンベヤ据付完了



写真⑦ かん供給コンベヤ据付完了



写真⑧ 不燃・粗大ごみ供給コンベヤ据付完了
