

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年7月度」工事進捗状況報告書

工事概要


工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事		
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内		
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日		
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体		
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)		
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他		
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株)
F A X		0772-45-1733	0772-45-1731

工事進捗状況

平成30年7月度の現場の作業状況は以下の通りです。

7/1～7/6	[ごみピット 躯体工事]	B2階躯体 型枠脱型作業・外壁防水作業
7/7・8、9～31	[ごみピット]	(7/7・8)西日本豪雨によりごみピット水没。(7/9～)復旧作業。
7/12～7/24	[ごみピット土工事]	B2階躯体外周埋戻し、砕石敷。
7/19～7/21	[ごみピット 土留め工事]	切梁・腹起し1段目・棚杭 解体、撤去。
7/25～7/31	[プラットフォーム・炉室エリア]	基礎掘削～捨コン(ごみピット連結の一部)
7/19～7/31	[リサイクルエリア鉄骨]	鉄骨建て方。
7/1～7/16	[プラント工事(リサイクル)]	かん圧縮機、プラスチック製容器包装圧縮梱包機、高速回転式破碎機 紙製容器包装処理系列 (受入ホッパ・供給コンベヤ・圧縮梱包装置) 破碎物搬送コンベヤ(1) 据付 【7月末現在出来高：14.0%】

状況写真撮影方向 (H30年7月31日撮影)

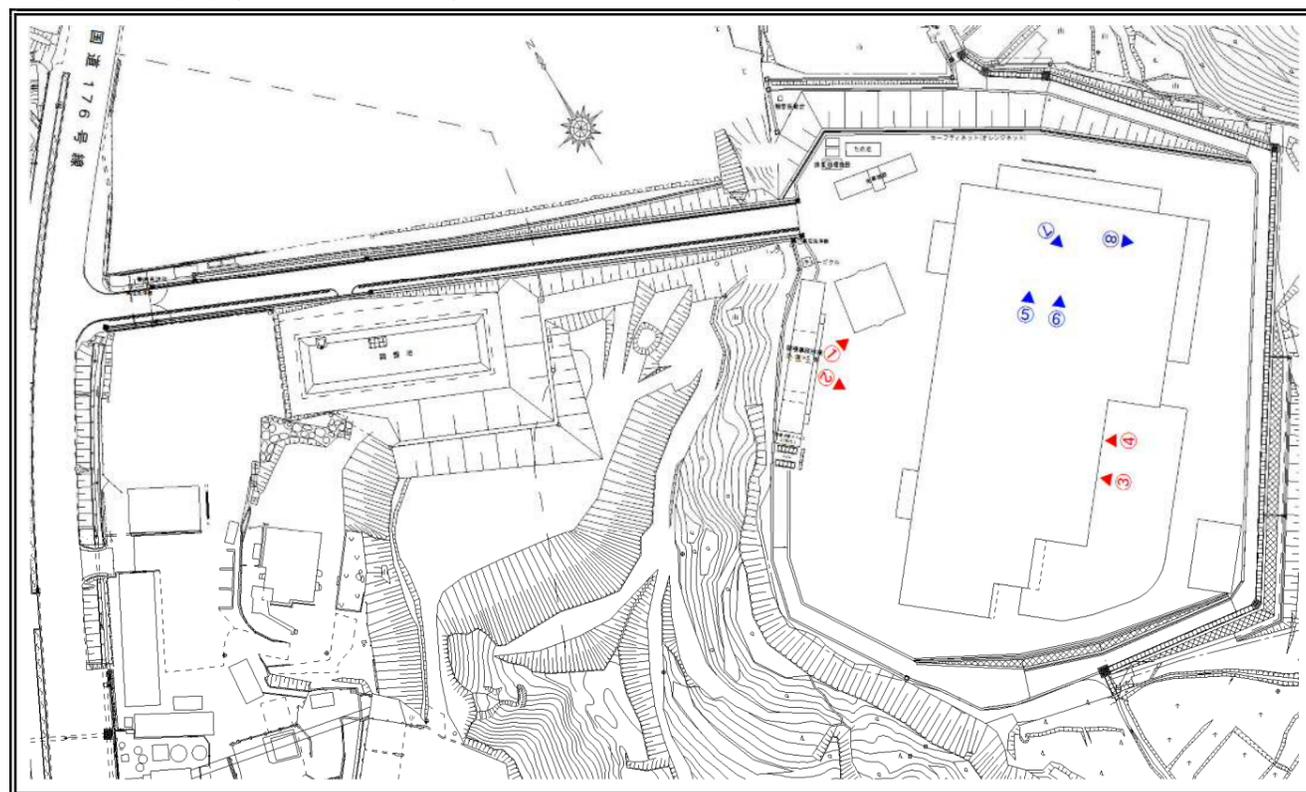

写真① 敷地東側全景(事務所から)



写真② 敷地西側全景(事務所から)



写真③ ごみピット (7/8 西日本豪雨 被災状況)



写真④ ごみピット (7/31 B1階躯体準備)



写真⑤ かん圧縮機 据付完了



写真⑥ 紙製容器包装処理系列 据付完了



写真⑦ プラスチック製容器包装圧縮梱包機 据付完了



写真⑧ 高速回転式破碎機 据付完了
