

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「令和元年12月度」工事進捗状況報告書

工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事		
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内		
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日		
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体		
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者: 近藤 克信)		
現 場 事 務 所	〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他		
T E L	(株)タクマ	0772-45-1732	金下建設(株) 0772-45-1730
F A X		0772-45-1733	0772-45-1731


工事進捗状況

令和元年12月度の現場の作業状況は以下の通りです。

12/1～12/28	[各エリア 仮設工事]	内外足場解体・組替、ごみクレーン足場組～解体、付属棟足場組。
12/1～12/28	[各エリア 内装工事]	内装壁・天井地下地組～ボード貼～クロス貼。OA707施工～床材貼。
12/1～12/28	[各エリア 吹付工事]	各エリア：外壁吹付・塗装。
12/1～12/28	[各エリア 建具工事]	各所：鋼製建具、硝子、シャッター取付、建具・扉吊込み。
12/1～12/28	[各エリア 左官工事]	各所：Con打放し化粧仕上げ・土間押さえ・各所補修。
12/1～12/28	[各エリア 塗装工事]	各所：鉄部塗装。
12/1～12/28	[各エリア その他工事]	各所：シダーコン打設、階段手摺取付、玄関底鉄骨建方、各所ソール。
12/1～12/28	[付属棟工事]	計量棟・洗車車庫棟：鉄骨完了～外壁・屋根工事。
12/1～12/28	[外構 埋設配管]	雨水排水埋設配管(重圧管)・会所柵設置。可変側溝設置。
12/1～12/28	[電気・機械設備工事]	各エリア：電気配線、給排水配管、消火配管。

【12月末現在出来高(建築)：92.0% (全体)：84.9%】

状況写真撮影方向(令和元年12月16日撮影)

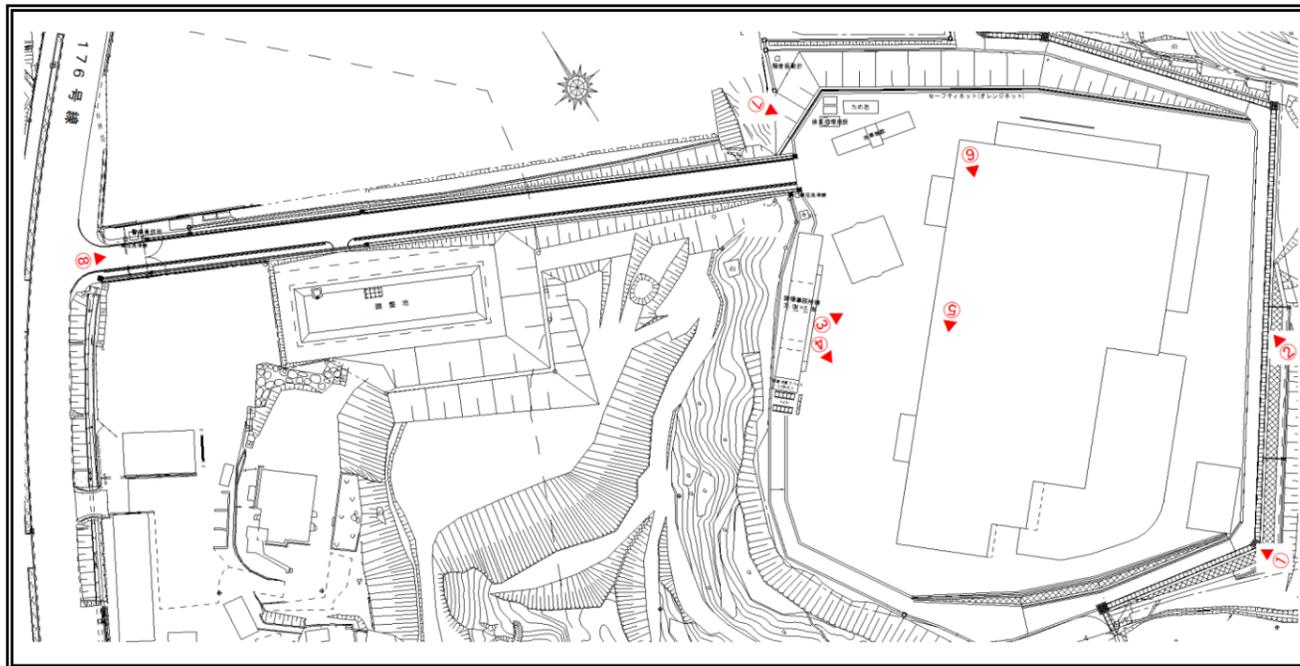

写真① 炉室・ごみピット・プラットフォームエリア(南角から)



写真② プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真③ リサイクル～ごみピットエリア(北西から)



写真④ プラットホーム・ごみピット・炉室エリア(北西から)



写真⑤ 3階見学者通路(中央制御室前)



写真⑥ 1階エントランスホール



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内
工 期	平成28年 4月22日～令和2年 6月30日
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体
現 場 代 理 人	木村 尊博 (プラント担当者：岡井裕之)
施 設 規 模	エネルギー回収型廃棄物処理施設 (ごみ焼却施設+メタンガス化施設)
	ごみ焼却施設：30トン/24h メタンガス化施設：20.6トン/24h
	マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工事進捗状況

令和元年12月度の現場の作業状況は以下の通りです。					
12/16～12/28	[エネ回収 (炉室)]	各所溶接仕舞	12/10～12/14	リサ各所	各所仕舞改造
12/11～12/27	[エネ回収 (ホッパエリア)]	ごみクレーン電気工事			
12/2～12/28	[エネ回収 (屋外)]	メタン発酵槽据付、基質配管据付、ガス貯留槽据付、屋外補機据付			
12/2～12/27	配管工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽 サポート配管敷設、各所気密試験			
12/2～12/28	電気工事	エネ回収(1FL～4FL)、メタン発酵槽 ケーブルラック・電線管・ケーブル敷設			
12/2～12/27	築炉工事	アンカー取付、赤煉瓦、耐火・断熱煉瓦取付、吹付施工			
12/16～12/28	保温工事	屋外保温材取付	12/2～12/27	塗装工事	エネ・リサ(各所) 塗装
12/11～12/27	試運転	使用前自主検査、機器・配管・盤内・動力シーケンスチェック、各所給油脂			
【12月末現在出来高 (プラント) : 77.8 % (全体) : 84.9%】					

状況写真撮影位置

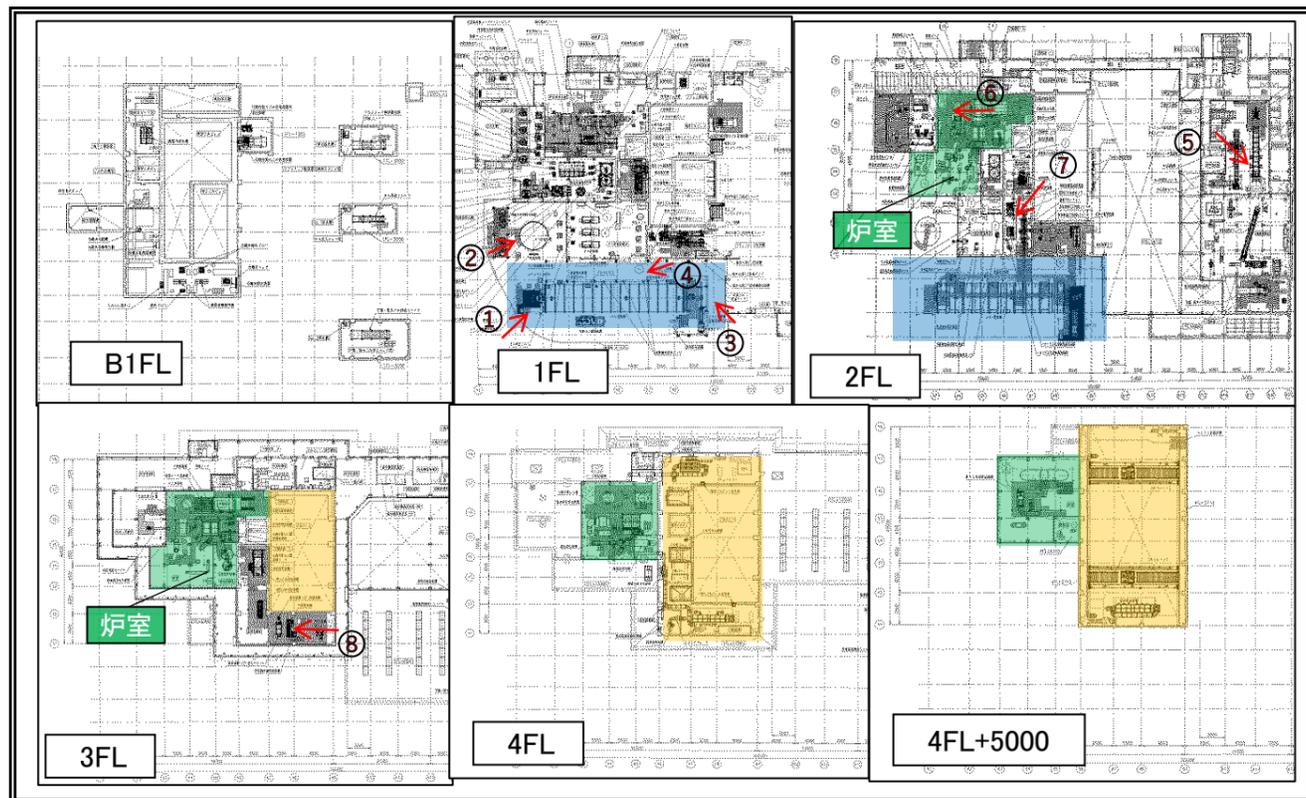

写真① メタン発酵槽




写真② ガス貯留槽



写真③ 基質配管




写真④ 基質配管

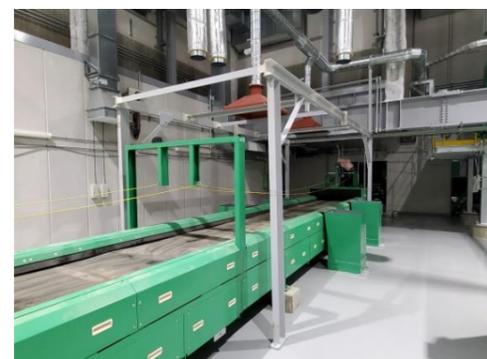

写真⑤ リサダクト・サポート



写真⑥ 耐火物 施工

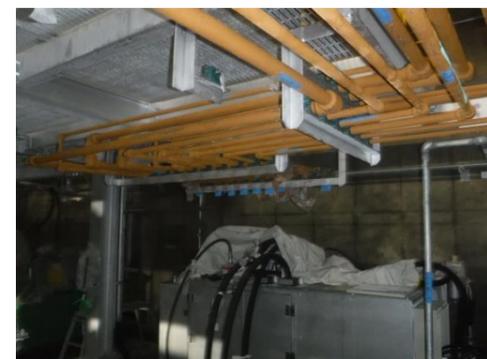

写真⑦ 配管・サポート 敷設



写真⑧ 選別設備室 塗装
