


工事概要

工 事 名	(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事			
工 事 場 所	京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内			
工 期	平成28年 4月22日～平成32年 5月31日			
請 負 者	タクマ・金下特定建設共同企業体			
現 場 代 理 人	木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)			
現 場 事 務 所	〒629－2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他			
T E L	(株)タクマ	0772－45－1732	金下建設(株)	0772－45－1730
F A X		0772－45－1733		0772－45－1731

工事進捗状況

平成30年8月度の現場の作業状況は以下の通りです。		
8/1～8/19	[リサイクルエリア 鉄骨]	鉄骨建て方、各所仕舞。
8/22～8/31	[リサイクルエリア 鉄筋]	1階柱・2G 梁配筋。
8/1～8/31	[プラットフォームエリア 基礎]	基礎掘削～配筋・型枠～Con打設、埋戻し。
8/1～8/31	[ごみピットエリア 躯体]	B1階躯体(柱・梁・壁・スラブ)配筋・型枠工事。
8/1～8/31	[炉室エリア 基礎・躯体]	基礎Con打設～B1階躯体(柱・梁・壁・スラブ)配筋・型枠工事。
8/20～8/25	[メタン発酵槽エリア 土工事]	基礎下地盤改良工事。
8/17～8/31	[屋外 雨水排水工事]	北側雨水埋設配管(重圧管・会所据付)工事。
【8月末現在出来高：15.5%】		

状況写真撮影方向（H30年8月29日撮影）

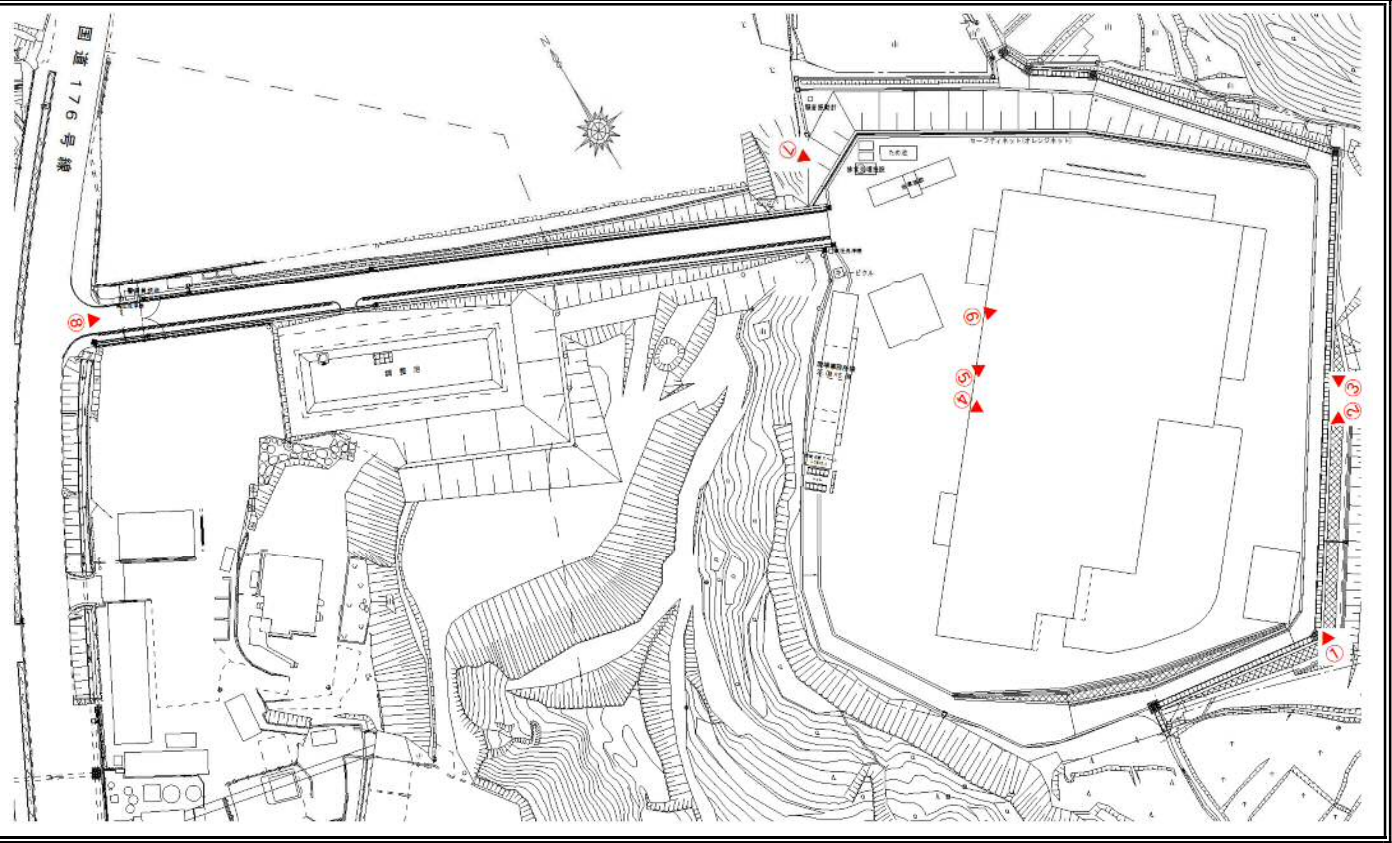

写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみピット・プラットフォーム(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真④ ごみピット B1階躯体配筋・型枠作業



写真⑤ プラットホーム 基礎埋戻し作業



写真⑥ リサイクル棟 1階 柱配筋作業



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計
